



Til Jakob Næsager (C)

Politikersvar til Jakob Næsager (C) – status på Lynetteholms perimeter

Jakob Næsager har den 26. november, 2024 stillet følgende spørgsmål:


"Hvad er status på etableringen af perimeteren og omkredsen af Lynetteholmen? Tak."

Økonomiforvaltningens svar:

Økonomiforvaltningen kan oplyse, at ifølge By & Havns kvartalsrapport for 3. kvartal 2024 indgik By & Havn den 24. oktober 2023 kontrakt om Lynetteholms entreprise Fase 2 med Per Aarsleff A/S. Anlægsarbejdet startede i november 2023.

Projektets anlægsaktiviteter følger den overordnede tidsplan. Jordmodtagelse i fase 1 er åbnet 29. juni 2023, og åbning af fase 2 sker i 2026. 54% af bundudskiftningen for fase 2 perimeterdæmningen er gennemført i første gravesæson. Forventeligt sidste gravesæson blev påbegyndt 1. oktober 2024.

Opdelingen mellem fase 1 og fase 2 kan ses i nedenstående figur:

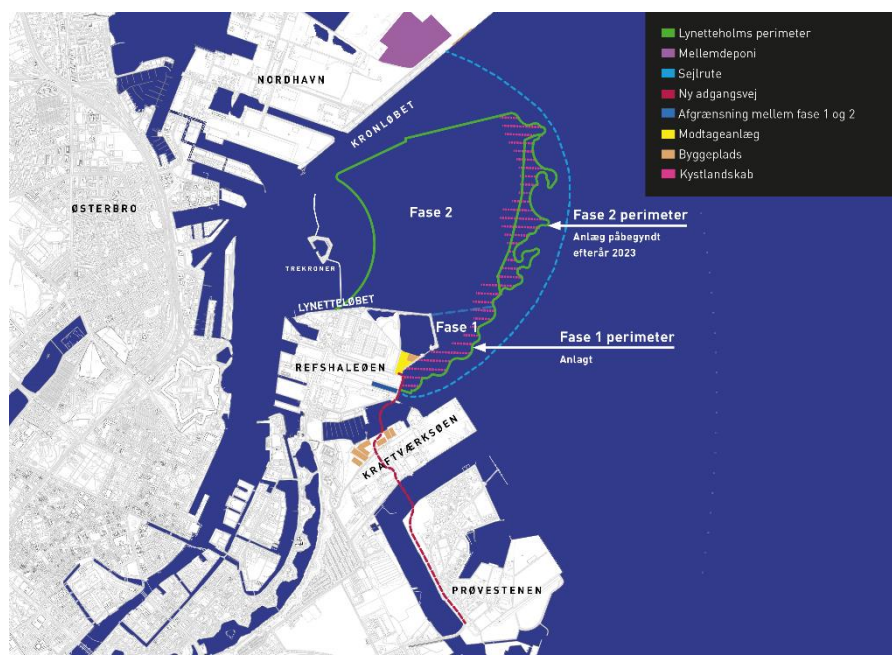

02-12-2024

Sagsnummer i F2
2024 - 24231

Dokumentnummer i F2
6795688


Sagsnummer eDoc
2024-0414281

Sagsbehandler
Sebastian Juel Frandsen


Anlæg af godt fem km. stendæmning rundt om fase 2 og knap to km midlertidig dæmning til det kommende kystlandskab blev igangsat i november 2023. Mere end 1,2 km. af stendæmningen mod Øresund i fase 2 er nu kommet op over vandoverfladen, og stendæmningen er ved at blive koblet sammen med fase 1-stendæmningen, som man kan se på nedenstående billede.



Lynetteholms sydligste kystfremspring er også kommet over vandoverfladen i løbet af oktober, og der arbejdes videre i november. De i alt tre strongpoint, som bliver etableret og kan ses på billedet herunder, bliver på sigt en slags opfyldte øer, og de skal sikre, at kystlandskabet ikke eroderer, når det i fremtiden er etableret med sand- og stenstrande.

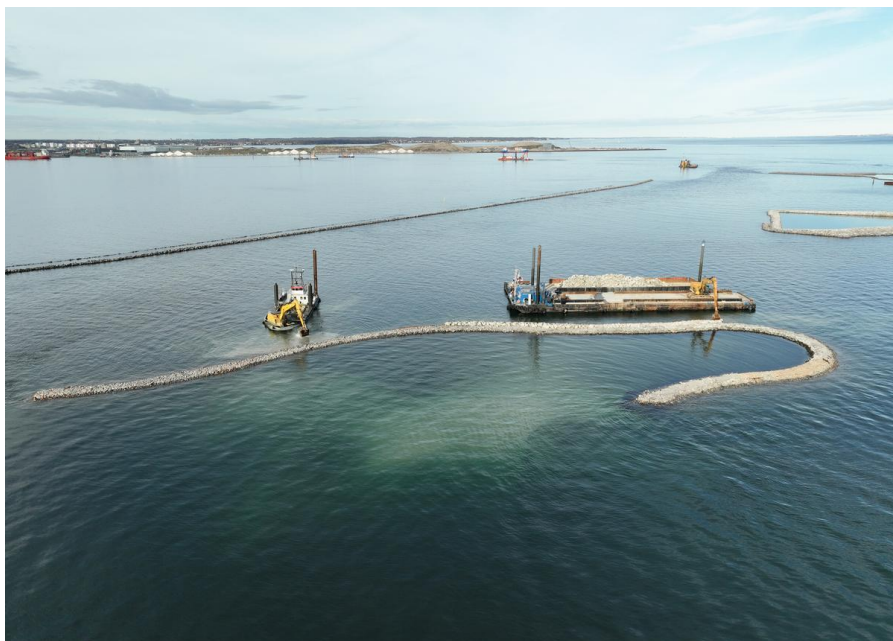

Jordopfyldningen af Lynetteholm skrider også fortsat planmæssigt frem. Den sydligste del af fase 1 har kun et mindre 'vandhul' tilbage. I det område, hvor der fortsat ses vand, bliver Lynetteholms opgravede havbund fyldt i. Jordopfyldet kan ses på billedet herunder.

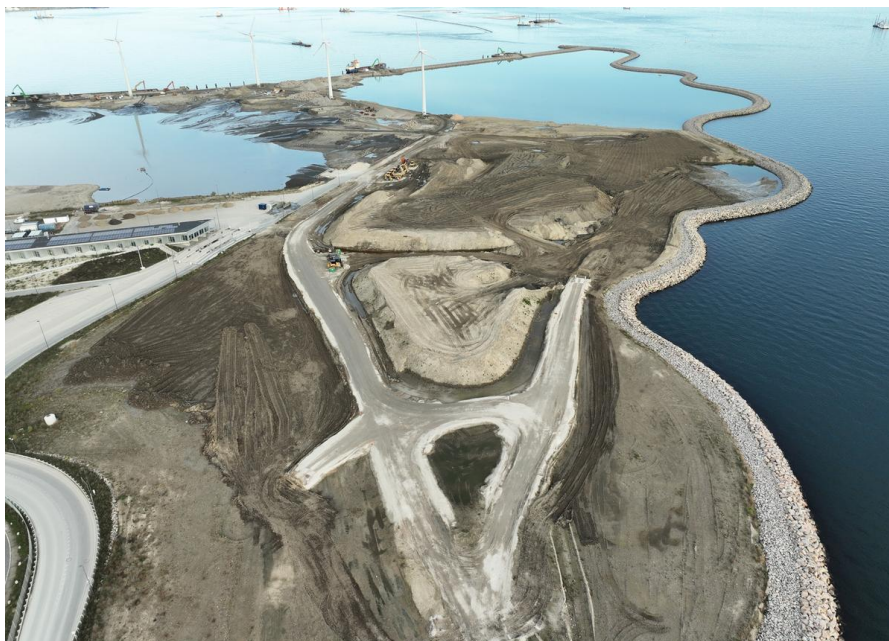

Udlægning af betonelementer til beskyttelse af spildevandsudløb U1 fra Rensningsanlæg Lynetten er afsluttet. Indbygning af 1.500 meter ny HOFOR spildevandsledning i vestlige dæmningsperimeter pågår.

Der er på nuværende tidspunkt kun en enkelt anden projektændring under myndighedsbehandling. Projektændringen omhandler vilkårsændring vedr. nyttiggørelse af havbundsmateriale indenfor Lynetteholms perimeterdæmning. I forbindelse med sagens behandling har Trafikstyrelsen forelagt ansøgningen og udkast til afgørelse for Miljøstyrelsen og Københavns Kommune. Høringen har desuden været offentliggjort på Trafikstyrelsens hjemmeside. Trafikstyrelsen har oplyst, at der forventes truffet afgørelse i sagen snarest.

Kvartalsrapporten kan findes på By & Havns hjemmeside her: [Kvartalsrapportering for Lynetteholm 3. kvartal 2024 - By & Havn](#)

Billederne er fra By & Havns anlægsnyhedsbrev for november, 2024, som sammen med tidligere anlægsnyhedsbreve kan findes her: [Røde blink i Kronløbet: Lynetteholms anlægsaktiviteter i november - By & Havn](#)
