



Bilag 6 Nye forsinkede projekter

Bilaget viser udviklingen i antal røde projekter de seneste tre år. Herudover redegøres for nye røde anlægsprojekter siden seneste anlægsoversigt, dvs. de nye anlægsprojekter, der er mere end seks måneder forsinkede. I bilaget redegøres for 30 nye forsinkede projekter.

Bilaget indeholder ligeledes årsagsforklaringer på de to af udvalgets anlægsprojekter, som forvaltningen betragter som de væsentligste forsinkede projekter. Projekterne er indmeldt til Økonomiudvalgets fjerde anlægsoversigt, som behandles af Økonomiudvalget den 21. november 2023.

23. oktober 2023

Sagsnummer i F2
2023 - 13688

Stab
Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

Indholdsfortegnelse


Indholdsfortegnelse	2
Udvikling i antal røde projekter	4
Vigtigste forsinkede projekter	5
Harrestrup Å.....	5
Medfinansiering af tiltag i Naturpark Amager	5
Nye røde projekter siden seneste anlægsoversigt	6
Amagervest	6
Tingvej m.fl., skybrudssikring	6
Havneruten, ny stibro over Slusen i Sydhavnen	6
Hallandsgade, genopretning B21	6
Naturpark Amager formidling og mobilisering	6
Indre By	7
Inderhavnsbroen, fejl og mangler	7
Peblinge Sø	7
Slotsholmen, HOFOR.....	7
Ahlefeldtsgade, genopretning B22	7
Prinsessegade, digitale tavler	8
Nørrebro	8
Blegdamsvej Nord, HOFOR.....	8
Blegdamsvej Syd, HOFOR	8
Valby	8
Kulbaneparken, nyt klubhus	8
Vesterbro-Kongens Enghave	9
Enghavevej, genopretning B23	9
Skolen i Sydhavnen.....	9
Østerbro	9
Omøgade, skybrudssikring	9
BK212 Willemoesgade, byggetilladelse.....	9
Flere Bydele	9
Gårdhaver, projektudvikling 2022	9
Roskilderutens fællesaktiviteter.....	10
Nulemissionszoner, foranalyse	10
Toiletpuljen 2019	10
Detektering af højresvingende trafik.....	10

Den Grønne Boulevard, foranalyse	10
Lersø Parkallé Syd, skybrudssikring	11
Hele Byen	11
CP V - Skiltning A-net + grønne ruter	11
Sundhed og Luft.....	11
Støjpuljen 2021 - Ansøgninger 2022	11
Støjpuljen 2021 - Ansøgninger 2023	11
Støjpuljen 2021 - Ansøgninger 2024	12
ALMA - Almenes digitale assistent.....	12
Cykelpakke - tryghedskortlægning	12

Udvikling i antal røde projekter

Figur 1 nedenfor viser udviklingen over røde projekter fra 2020 til 2023 i de kvartalsvise anlægsoversigter. Baggrunden for det større antal røde projekter i fjerde anlægsoversigt er, at der i 2023 indtil videre er ibrugtaget væsentligt færre røde projekter end i den tilsvarende periode i 2022. Frem til og med oktober 2022 var der ibrugtaget 44 røde projekter mens der i 2023 kun er ibrugtaget 21 røde projekter. Det forventes, at antallet af røde projekter nedbringes væsentligt i november og december 2023, idet 31 røde projekter forventes ibrugtaget i denne periode, mens den tilsvarende forventning var 19 røde projekter i 2022.

Figur 1. Udviklingen i antal forsinkede (røde) projekter 2020-2023

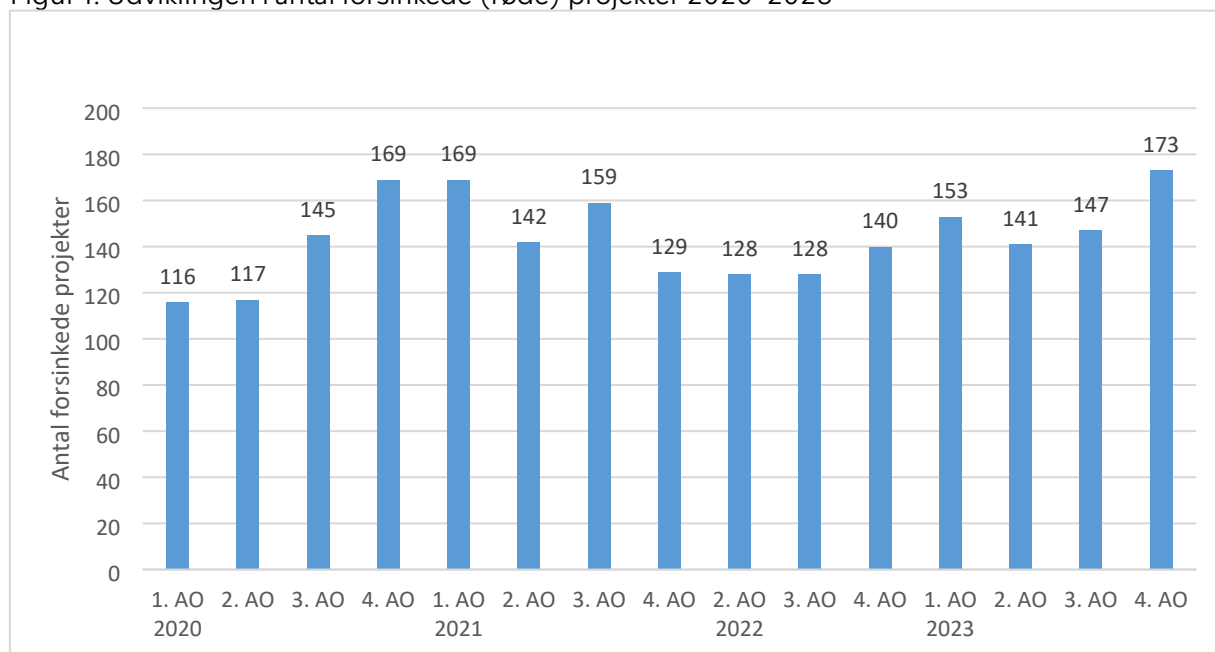

Note 1. Da første anlægsoversigt fra 2022 gennemføres i en reduceret udgave uden opfølgning på antal røde projekter, fremgår denne ikke.

Vigtigste forsinkede projekter

Forvaltningen skal i forbindelse med anlægsoversigten indmelde til Økonomiforvaltningen, hvilke projekter forvaltningen vurderer, er de to vigtigste forsinkede projekter på nuværende tidspunkt. Projekterne udvælges på baggrund af en samlet vurdering af projekternes økonomi, tidsplan og sammenhæng med øvrige projekters eksekvering. De to projekter er:

Projekt	Harrestrup Å
Opr. Budgetgodkendelse	Budgetaftale 2011
Vedttaget ibrugtagning	Juni 2026
Forventet ibrugtagning	December 2027
Forsinkelse i mdr. revideret	42
Forklaring på forsinkelse	<p>På baggrund af fordyrende forhold i projektet som fremlagt for udvalget i indstillingen "Tillægsbevilling til gennemførelse af Harrestrup Å i Vigerslevparken naturgenopretning og skybrudssikring, Valby" (TMU 12. juni 2023) besluttede udvalget at henvise finansiering af merudgifterne til det fulde anlægsprojekt til forhandlingerne om Budget 2024</p> <p>Med Budget 2024 blev der afsat 48 mio. kr. til at finansiere det fulde projekt som planlagt. I 2024 udarbejdes et udbudsprojekt og der gennemføres et EU-entrepriseudbud, så anlægsarbejderne kan igangsættes i 2025 til 2027. Den nærmere planlægning kan betyde, at anlægsarbejderne strækker sig ind i 2028. TMU vil ultimo 2023 få forelagt indstilling om projektforslaget for det samlede projekt, forhøjelse af bevillingen til skybrudssikring samt en kvalificeret tidsplan for det samlede projekt.</p>
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen forsøger at optimere de efterfølgende projektfaser.

Projekt	Medfinansiering af tiltag i Naturpark Amager
Opr. Budgetgodkendelse	Budgetaftale 2017
Vedttaget ibrugtagning	August 2020
Forventet ibrugtagning	Oktober 2025
Forsinkelse i mdr. revideret	62
Forklaring på forsinkelse	<p>Forsinkelsen skyldes, at der ikke oprindeligt var indtænkt tid til en fredningssag, hvilket der viste sig at blive behov for. Projektet afventede en fredningsafgørelse, som kom den 15. april 2021. Afgørelsen muliggjorde, at anlægget kunne opstartes og ibrugtages i 2023. Men Fredningsnævnets afgørelse blev i maj 2022 påklaget til Miljø- og Fødevarerklagenævnet af Amager Fælleds Venner og Danmarks Naturfredningsforening. Afgørelsen fra Miljø- og Fødevarerklagenævnet kom i starten af juli 2022, hvor fredningsforslaget blev hjemvist til ny behandling i Fredningsnævnet, og projektet afventer derfor en ny fredningssag, som forventes at tage omkring to år.</p>
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen forsøger at optimere de efterfølgende projektfaser.

Nye røde projekter siden seneste anlægsoversigt

I det følgende fremgår de projekter, som siden seneste anlægsoversigt er blevet mere end seks måneder forsinkede.

Forklaring på forsinkelser forklares med de standardforklaringer der blev taget til efterretning af Teknik- og Miljøudvalget 13. marts 2023. Dette betyder, at der er tale om standardforklaringer som ikke i alle tilfælde afspejler alle faktorer bag forsinkelsen, men angiver den primære årsag til, at projektet er forsinket.

De tre nedenstående projekter, der er angivet som forsinket på grund af manglende anlægsmåltal skyldes forsinkelser på baggrund af Økonomiudvalgets beslutning om at reducere udvalgets anlægsmåltal i 2023 og den efterfølgende beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 21. august 2023 om udskydelse af projekterne til 2024.

Amagervest

Projekt	Tingvej m.fl., skybrudssikring
Opr. Budgetgodkendelse	Øvrige aftaler
Vedtaget ibrugtagning	Marts 2026
Forventet ibrugtagning	December 2026
Forsinkelse i mdr. revideret	9
Forklaring på forsinkelse	Forsinkelsen skyldes, at projektet gennemføres i koordination med andre projekter, og at projektet fremdrift afhænger af andre projekters afslutning eller fremdrift.

Projekt	Havneruten, ny stibro over Slusen i Sydhavnen
Opr. Budgetgodkendelse	Budgetaftale 2023
Vedtaget ibrugtagning	December 2024
Forventet ibrugtagning	Februar 2026
Forsinkelse i mdr. revideret	14
Forklaring på forsinkelse	Forsinkelsen skyldes, at Teknik- og Miljøudvalget har besluttet at udskyde projektet på grund af manglende anlægsmåltal.

Projekt	Hallandsgade, genopretning B21
Opr. Budgetgodkendelse	Budgetaftale 2021
Vedtaget ibrugtagning	December 2024
Forventet ibrugtagning	December 2025
Forsinkelse i mdr. revideret	12
Forklaring på forsinkelse	Forsinkelsen skyldes, at projektet gennemføres i koordination med andre projekter, og at projektet fremdrift afhænger af andre projekters afslutning eller fremdrift.

Projekt	Naturpark Amager formidling og mobilisering
---------	--

Opr. Budgetgodkendelse	Budgetaftale 2017
Vedtaget ibrugtagning	December 2023
Forventet ibrugtagning	December 2024
Forsinkelse i mdr. revideret	12
Forklaring på forsinkelse	Forsinkelsen skyldes, at projektet gennemføres i koordination med andre projekter, og at projektet fremdrift afhænger af andre projekters afslutning eller fremdrift.

Indre By

Projekt	Inderhavnsbroen, fejl og mangler
Opr. Budgetgodkendelse	Overførselssagen 2021-2022
Vedtaget ibrugtagning	August 2024
Forventet ibrugtagning	Juli 2025
Forsinkelse i mdr. revideret	11
Forklaring på forsinkelse	Forsinkelsen skyldes stigende priser på anlæg*.

* Borgerrepræsentationen har den 21. september 2023 besluttet, at projektet tildeles midler fra PL-puljen til stigende priser på anlæg, så projektet kan gennemføres som planlagt dog med forsinkelse.

Projekt	Peblinge Sø
Opr. Budgetgodkendelse	Øvrige aftaler
Vedtaget ibrugtagning	December 2023
Forventet ibrugtagning	December 2028
Forsinkelse i mdr. revideret	60
Forklaring på forsinkelse	Forsinkelsen skyldes, at der skal gennemføres foranalyse for en række klimaprojekter, herunder projektet vedr. Peblinge Sø. Som led i analysen skal det vurderes, med udgangspunkt i beregninger af vandmængder, om der reelt er behov at gennemføre projektet. Forsinkelsen skyldes herudover uafklaretheder i forbindelse med udledningstilladelse til De Indre Søer.

Projekt	Slotsholmen, HOFOR
Opr. Budgetgodkendelse	Øvrige aftaler
Vedtaget ibrugtagning	December 2025
Forventet ibrugtagning	December 2027
Forsinkelse i mdr. revideret	24
Forklaring på forsinkelse	Forsinkelsen skyldes, at projektet gennemføres i koordination med andre projekter, og at projektets fremdrift afhænger af andre projekters afslutning eller fremdrift.

Projekt	Ahlefeldtsgade, genopretning B22
Opr. Budgetgodkendelse	Budgetaftale 2022

Vedtaget ibrugtagning	December 2022
Forventet ibrugtagning	November 2023
Forsinkelse i mdr. revideret	11
Forklaring på forsinkelse	Forsinkelsen skyldes uforudseelige forhold i jorden, fx fund af uregistrerede ledninger.

Projekt	Prinsessegade, digitale tavler
Opr. Budgetgodkendelse	Budgetaftale 2022
Vedtaget ibrugtagning	Oktober 2022
Forventet ibrugtagning	December 2023
Forsinkelse i mdr. revideret	14
Forklaring på forsinkelse	Forsinkelsen skyldes lange leveringstider på materialer.

Nørrebro

Projekt	Blegdamsvej Nord, HOFOR
Opr. Budgetgodkendelse	Øvrige aftaler
Vedtaget ibrugtagning	December 2023
Forventet ibrugtagning	December 2029
Forsinkelse i mdr. revideret	72
Forklaring på forsinkelse	Forsinkelsen skyldes, at projektet gennemføres i koordination med andre projekter, og at projektet fremdrift afhænger af andre projekters afslutning eller fremdrift.

Projekt	Blegdamsvej Syd, HOFOR
Opr. Budgetgodkendelse	Øvrige aftaler
Vedtaget ibrugtagning	December 2023
Forventet ibrugtagning	December 2029
Forsinkelse i mdr. revideret	72
Forklaring på forsinkelse	Forsinkelsen skyldes, at projektet gennemføres i koordination med andre projekter, og at projektet fremdrift afhænger af andre projekters afslutning eller fremdrift.

Valby

Projekt	Kulbaneparken, nyt klubhus
Opr. Budgetgodkendelse	Budgetaftale 2022
Vedtaget ibrugtagning	December 2022
Forventet ibrugtagning	Maj 2024
Forsinkelse i mdr. revideret	17
Forklaring på forsinkelse	Forsinkelsen skyldes, at myndighedsbehandling, fx tilladelse fra Politi, frednings sag, byggesags- eller lokalplansbehandling, har taget længere tid end forventet.

Vesterbro-Kongens Enghave

Projekt	Enghavevej, genopretning B23
Opr. Budgetgodkendelse	Budgetaftale 2023
Vedtaget ibrugtagning	December 2023
Forventet ibrugtagning	August 2024
Forsinkelse i mdr. revideret	8
Forklaring på forsinkelse	Forsinkelsen skyldes, at udbudsprocessen har taget længere tid end forventet.

Projekt	Skolen i Sydhavnen
Opr. Budgetgodkendelse	Overførselssag 2019-2020
Vedtaget ibrugtagning	December 2023
Forventet ibrugtagning	December 2025
Forsinkelse i mdr. revideret	24
Forklaring på forsinkelse	Forsinkelsen skyldes, at projektet gennemføres i koordination med andre projekter, og at projektet fremdrift afhænger af andre projekters afslutning eller fremdrift.

Østerbro

Projekt	Omøgade, skybrudssikring
Opr. Budgetgodkendelse	Øvrige aftaler
Vedtaget ibrugtagning	December 2023
Forventet ibrugtagning	December 2024
Forsinkelse i mdr. revideret	12
Forklaring på forsinkelse	Forsinkelsen skyldes, at projektet gennemføres i koordination med andre projekter, og at projektets fremdrift afhænger af andre projekters afslutning eller fremdrift.

Projekt	BK212 Willemoesgade, byggetilladelse
Opr. Budgetgodkendelse	Øvrige aftaler
Vedtaget ibrugtagning	December 2022
Forventet ibrugtagning	December 2024
Forsinkelse i mdr. revideret	24
Forklaring på forsinkelse	Forsinkelsen skyldes, at projektet gennemføres i koordination med andre projekter, og at projektets fremdrift afhænger af andre projekters afslutning eller fremdrift.

Flere Bydele

Projekt	Gårdhaver, projektudvikling 2022
Opr. Budgetgodkendelse	Øvrige aftaler
Vedtaget ibrugtagning	December 2023

Forventet ibrugtagning	Marts 2025
Forsinkelse i mdr. revideret	15
Forklaring på forsinkelse	Forsinkelsen skyldes, at Teknik- og Miljøudvalget har besluttet at udskyde projektet på grund af manglende anlægsmåtal.

Projekt	Roskilderutens fællesaktiviteter
Opr. Budgetgodkendelse	Budgetaftale 2019
Vedtaget ibrugtagning	November 2021
Forventet ibrugtagning	December 2023
Forsinkelse i mdr. revideret	13
Forklaring på forsinkelse	Forsinkelsen skyldes, at projektet gennemføres i koordination med andre projekter, og at projektet fremdrift afhænger af andre projekters afslutning eller fremdrift.

Projekt	Nulemissionszoner, foranalyse
Opr. Budgetgodkendelse	Budgetaftale 2023
Vedtaget ibrugtagning	April 2023
Forventet ibrugtagning	December 2024
Forsinkelse i mdr. revideret	20
Forklaring på forsinkelse	Forsinkelsen skyldes, at myndighedsbehandling, fx tilladelse fra Politi, fredningssag, byggesags- eller lokalplansbehandling, har taget længere tid end forventet.

Projekt	Toiletpuljen 2019
Opr. Budgetgodkendelse	Øvrige aftaler
Vedtaget ibrugtagning	December 2025
Forventet ibrugtagning	December 2027
Forsinkelse i mdr. revideret	24
Forklaring på forsinkelse	Forsinkelsen skyldes, at den eksterne leverandør er blevet forsinket ift. aftalen.

Projekt	Detektering af højresvingende trafik
Opr. Budgetgodkendelse	Budgetaftale 2021
Vedtaget ibrugtagning	December 2023
Forventet ibrugtagning	December 2024
Forsinkelse i mdr. revideret	12
Forklaring på forsinkelse	Forsinkelsen skyldes, at Teknik- og Miljøudvalget har besluttet at udskyde projektet på grund af manglende anlægsmåtal.

Projekt	Den Grønne Boulevard, foranalyse
Opr. Budgetgodkendelse	Budgetaftale 2021
Vedtaget ibrugtagning	December 2023
Forventet ibrugtagning	December 2024
Forsinkelse i mdr. revideret	12
Forklaring på forsinkelse	Forsinkelsen skyldes, at den eksterne leverandør er blevet forsinket ift.

	aftalen.
--	----------

Projekt	Lersø Parkallé Syd, skybrudssikring
Opr. Budgetgodkendelse	Øvrige aftaler
Vedtaget ibrugtagning	December 2023
Forventet ibrugtagning	December 2024
Forsinkelse i mdr. revideret	12
Forklaring på forsinkelse	Forsinkelsen skyldes, at projektet gennemføres i koordination med andre projekter, og at projektets fremdrift afhænger af andre projekters afslutning eller fremdrift.

Hele Byen

Projekt	CP V - Skiltning A-net + grønne ruter
Opr. Budgetgodkendelse	Budgetaftale 2012
Vedtaget ibrugtagning	December 2020
Forventet ibrugtagning	November 2023
Forsinkelse i mdr. revideret	35
Forklaring på forsinkelse	Forsinkelsen skyldes, at myndighedsbehandling, fx tilladelse fra Politi, frednings sag, byggesags- eller lokalplansbehandling, har taget længere tid end forventet.

Projekt	Sundhed og Luft
Opr. Budgetgodkendelse	Øvrige aftaler
Vedtaget ibrugtagning	December 2022
Forventet ibrugtagning	December 2023
Forsinkelse i mdr. revideret	12
Forklaring på forsinkelse	Forsinkelsen skyldes, at udbudsprocessen har taget længere tid end forventet.

Projekt	Støjpuljen 2021 - Ansøgninger 2022
Opr. Budgetgodkendelse	Øvrige aftaler
Vedtaget ibrugtagning	December 2025
Forventet ibrugtagning	December 2026
Forsinkelse i mdr. revideret	12
Forklaring på forsinkelse	Forsinkelsen skyldes, at projektet afventer evt. godkendelse i privat ejerforening, andelsforening el. lignende.

Projekt	Støjpuljen 2021 - Ansøgninger 2023
Opr. Budgetgodkendelse	Øvrige aftaler
Vedtaget ibrugtagning	December 2026
Forventet ibrugtagning	December 2027
Forsinkelse i mdr. revideret	12
Forklaring på forsinkelse	Forsinkelsen skyldes, at projektet afventer godkendelse i privat

	ejerforening, andelsforening el. lignende.
--	--

Projekt	Støjpuljen 2021 - Ansøgninger 2024
Opr. Budgetgodkendelse	Øvrige aftaler
Vedtaget ibrugtagning	December 2027
Forventet ibrugtagning	December 2028
Forsinkelse i mdr. revideret	12
Forklaring på forsinkelse	Forsinkelsen skyldes, at projektet afventer godkendelse i privat ejerforening, andelsforening el. lignende.

Projekt	ALMA - Almenes digitale assistent
Opr. Budgetgodkendelse	Overførelsessag 2022-2023
Vedtaget ibrugtagning	December 2023
Forventet ibrugtagning	December 2024
Forsinkelse i mdr. revideret	12
Forklaring på forsinkelse	Forsinkelsen skyldes, at projekteringsfasen har taget længere tid end forventet.

Projekt	Cykelpakke - tryghedskortlægning
Opr. Budgetgodkendelse	Budgetaftale 2020
Vedtaget ibrugtagning	December 2022
Forventet ibrugtagning	December 2023
Forsinkelse i mdr. revideret	12
Forklaring på forsinkelse	Forsinkelsen skyldes mangel på medarbejderressourcer.
