



## Notat

Til Brønshøj-Husum Lokaludvalg

### Status på spildevandsprojekter ved Utterslev Mose, Brønshøj-Husum

Utterslev Mose er omfattet af Vandområdeplan 2021-2027. I planen er er fastsat bindende krav om at fosforbelastningen til mosen skal nedbringes, så målet om en god miljøtilstand kan nås.

Selvom der allerede har været gennemført tiltag for at begrænse overløb, modtager Utterslev Mose stadig betydelige mængder spildevand via overløb fra fælleskloakken, når det regner. Det vigtigste virkemiddel til at sikre en bedre vandkvalitet og målopfyldelse er at nedbringe eller lukke overløbene, samt sikre en tilstrækkelig vandtilførsel til mosen.

Gladsaxe og Københavns Kommune samt de tilknyttede forsyningselskaber arbejder med reduktion af overløbene og separatkloakering, som kan være med til at sikre og forbedre vandtilstrømningen til mosen. På budget 2024 blev der desuden afsat midler til at undersøge muligheden for at oppumpe grundvand og udlede det til mosen.

Nedenfor ses en oversigt over overløbene til Utterslev Mose, samt status for de planlagte reduktioner:

#### U11

Frem mod 2027 vil overløbet blive reduceret med 85%.

Reduktionen opnås dels ved separatkloakering af Tingbjerg, dels ved udbygning af bassinkapaciteten på Gyngemoseværket i Gladsaxe Kommune. Projektet omkring bassinet har mødt udfordringer med jordhåndteringen og er derfor forsinket. Det forventes dog, at projektet kan færdiggøres inden 2027.

Gladsaxe Kommune har vedtaget at oplandet til U11 skal separatkloakeres. Derfor forventes U11 at være helt nedlagt som overløb og omdannet til regnvandsudløb omkring 2050.

#### UM26

Overløbet nedlægges og omdannes til regnvandsudløb som følge af separatkloakeringen af Tingbjerg. Projektet forventes gennemført i 2027.

#### UM16-21

Det er besluttet at etablere et nyt rørbassin (stort underjordisk rør med plads til store vandmængder) langs den sydlige del af mosen, som vil reducere overløbene med 75%. Anlægget forventes at være i drift i 2027.

#### U13-19:

22-11-2023

Sagsnummer i F2  
2023 - 17620

Dokumentnummer i F2  
112630

Sagsnummer i eDoc  
2023-0412861

Bygge-, Parkerings- og Miljømyndighed

Njalsgade 13  
2300 København S


EAN-nummer  
5798009809452

Overløbene nedlægges efter anlæggelsen af Svanemøllen Skybrudstunnel. Pt. forventes tunnellen at stå færdig i 2031. Sagen vedrørende miljøvurderingen af projektet afventer pt. behandling hos Miljøstyrelsen.

#### UM14:

I Københavns Kommunes spildevandsplan er det besluttet, at overløbet skal reduceres til en gang årligt. Den konkrete projektering udestår, men det forventes, at der kan gennemføres de nødvendige tiltag senest i 2027.

Figur 1 Oversigt over overløbsbygværker til Utterslev Mose

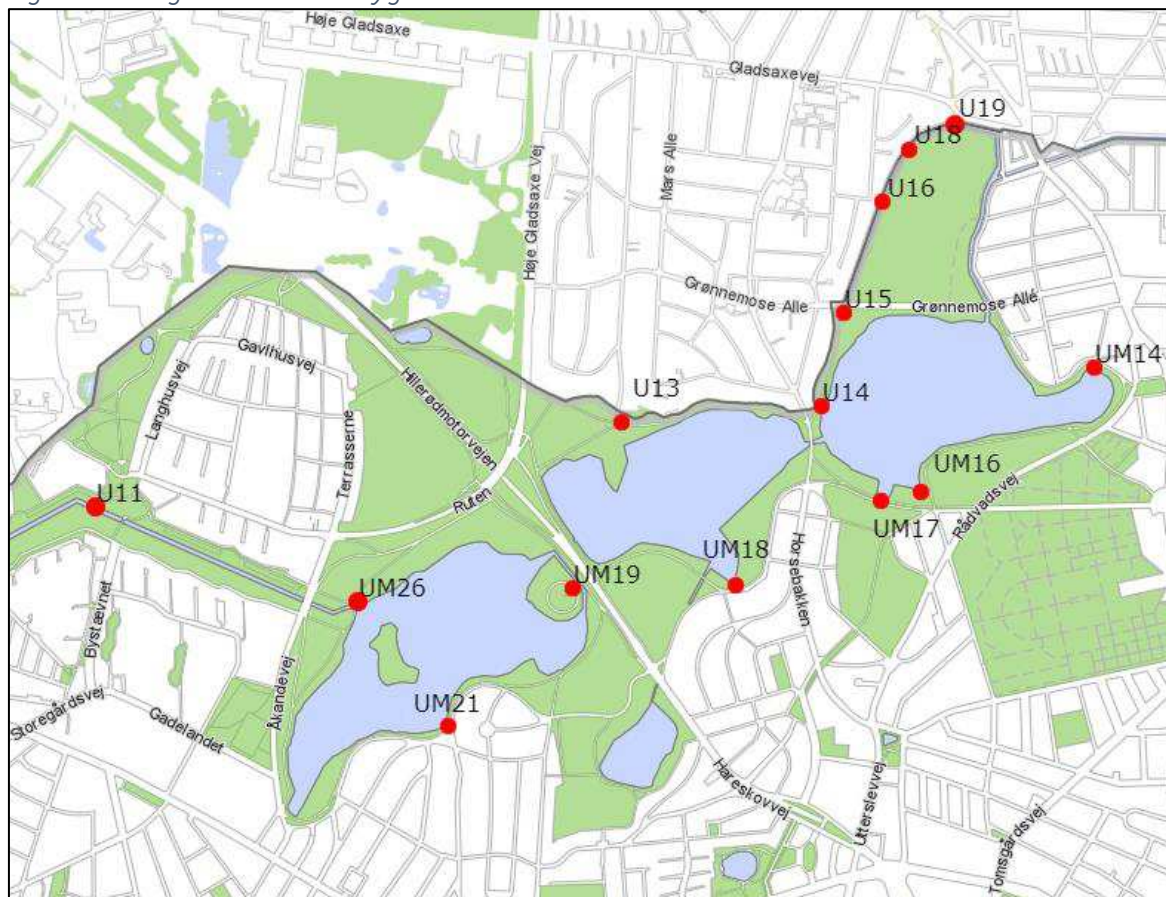

Lena Kongsbach  
Vicedirektør
