

# I. Etape



**Nedlæggelse af BMJ  
Allé og opvisningsbane.  
Anlæg Kunstgræsbane.  
Byggeplads på  
Den Franske Plads.**



start: juni 2009  
slut: december 2009

**Anlæg Danseplads**

start: juni 2009  
slut: august 2009

**Anlæg Kastebane  
Indgang GNH Plads**

start: december 2009  
slut: marts 2010

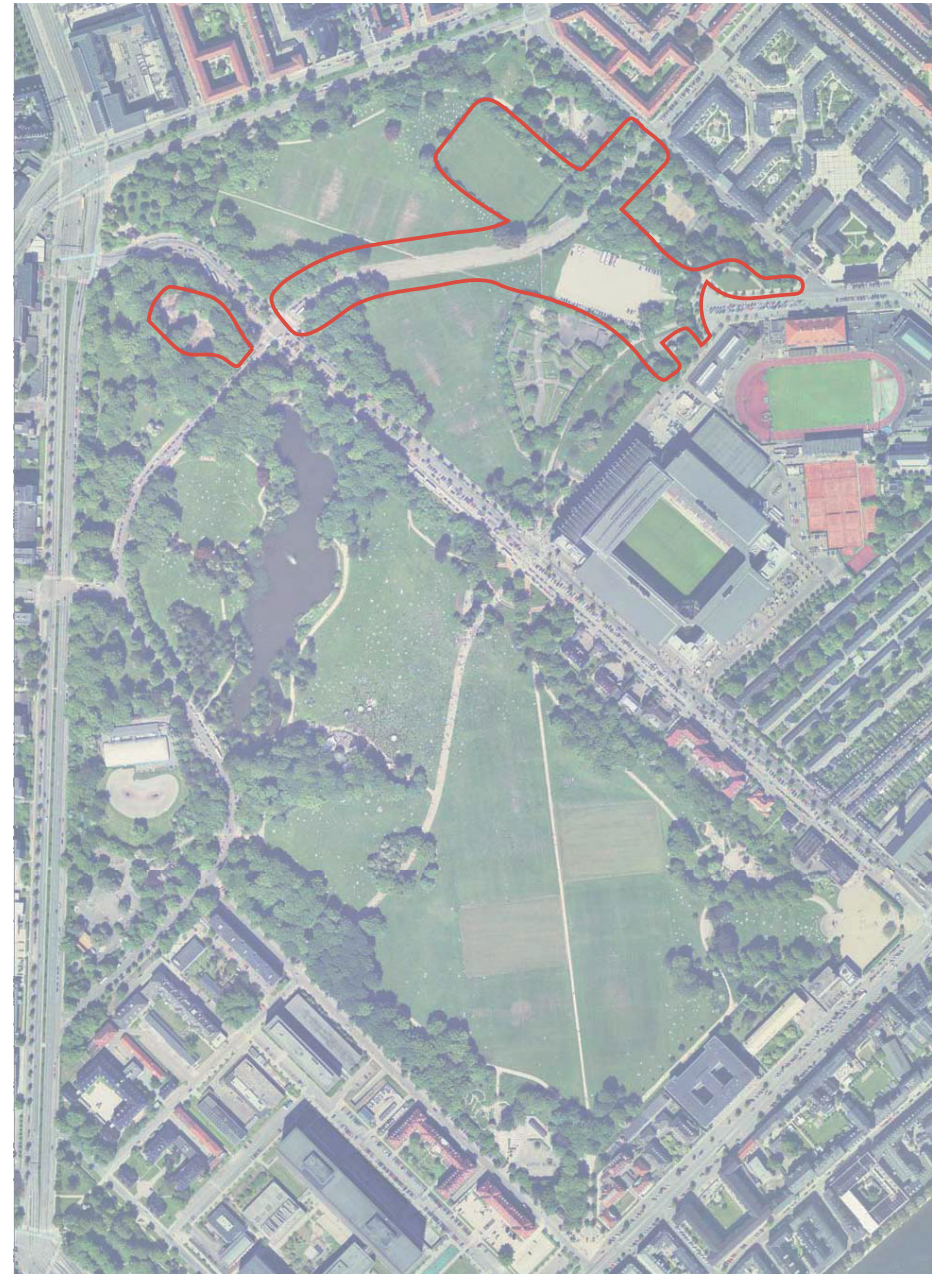


## 2. Etape

### Anlæg Skatepark

start: august 2009  
slut: december 2010


1. Skatebowl
2. Skatepark
3. Rullesti
4. Materialegård
5. Hegn ved soppesø



# 3. Etape

## Anlæg Elektronisk Legeplads

start: september 2010  
slut: november 2010

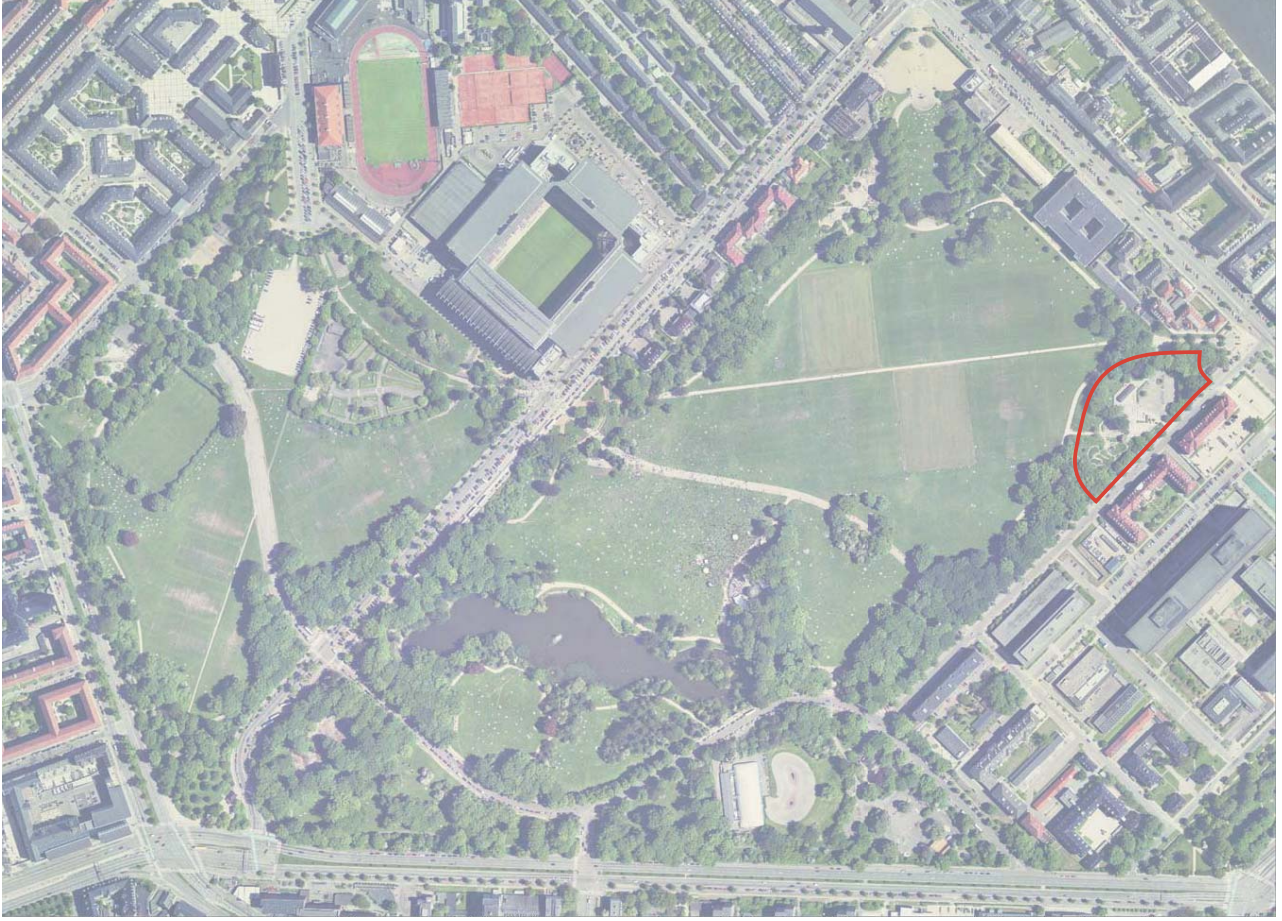

## 4. Etape

### Anlæg Klosterfælled

start: dec. 2010  
slut: aug. 2012

1. Filosofgang
2. Cykelstier
3. Legeområder og multibaner  
v. Serridslevvej
4. Indgang  
- Øster Allé / Parken
5. Rasteplads
6. Den Franske Plads
7. Trafiklegeplads

apr. 2009    juli 2009    okt. 2009    jan. 2010    apr. 2010    juli 2010    okt. 2010    jan. 2011    apr. 2011    juli 2011    okt. 2011    jan. 2012    apr. 2012    juli 2012    okt. 2012



Start på dispositonsforslag/projektforslag for Klosterfælleden og trafiklegeplads sker først når trafiklegeplads er færdig til projektering.  
Projektering starter først efter politisk godkendelse af projektforslag.




# 5. Etape

## Anlæg Blegdamsfælled

start: maj. 2011  
slut: dec. 2012

- |                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Filosofgang                    | 8. Stjernehaven |
| 2. Rastepladser                   | 9. Amfi         |
| 3. Gang- og cykelstier<br>Indgang | 10. Fælledsøen  |
| 4. - Øster Allé/ Parken           | 11. Bro         |
| 5. - Trianglen                    | 12. Søstien     |
| 6. - Blegdamsvej                  | 13. Skovstien   |
| 7. - Frederik d .V's Vej          |                 |




Start på dispositionsforslag/projektforslag for Blegdamsfælled sker først når Klosterfælled og Trafiklegeplads er færdig til projektering.  
Projektering starter først efter politisk godkendelse af projektforslag og når udbudsmateriale for Klosterfælled og Trafiklegeplads er færdig. Anlæg er afhængig af færdiggørelsen af Trianglen Metro.



## 6. Etape

### Anlæg Vibehus Metroplads

start: aug. 2011  
slut: dec. 2011



Start på dispositionsforslag/projektforslag for Vibehus Runddel sker først når Blegdamsfællend er færdig til projektering. Projekteringen starter først efter politisk godkendelse og når udbudsmaterialet for Blegdamsfællend er færdig. Anlæg er afhængig af færdiggørelse af Vibehus Metro.

