



12-10-2010

Bilag 1: Status for monitorerede projekter pr. 1. okt. 2010

Sagsnr.
2010-145151

1. Titel på projektet: Brobygning på Sjælør Boulevard
Om projektet: Formålet med projektet er at bygge bro mellem de lokale børn og unge og foreningslivet, samt at øge andelen af børn og unge fra boligområdet der er tilknyttet klub eller forening. Konkrete indsatser i forbindelse hermed er blandt andet etablering af en bemandede idrætscontainer hvor målgruppen har mulighed for at stifte bekendtskab med forskellige idrætsgrene.
Projektholder: Foreningen Os på Sjælør
Bevillingsgivende pulje: Brobygningspuljen
Forvaltning: Kultur- og Fritidsforvaltningen
Budgetramme: Kommunal finansiering 219.400 kr. Samlet budget ikke oplyst.
Projektperiode: Startdato: 01. august 2009 Slutdato: 31. juli 2011

Dokumentnr.
2010-699417

Sagsbehandler
Tatjana t'Felt

80006 - BIF Centralt

Bernstorffsgade 17, st

1592 København V

Telefon
3317 3348

E-mail
TR40@bif.kk.dk

www.kk.dk

Fremdrift:

Projektet har god fremdrift i henhold til milepælsplanen. Projektet har på aktivitetsniveau opfyldt de fastsatte succeskriterier:

Der er rekrutteret 7 frivillige foreningsguide, mod et succeskriterium på 5 foreningsguide. Der er etableret kontakt til 41 unge fra lokalområdet, mod et succeskriterium på 40. Der er indgået aftale med 4 idrætsklubber om modtagelse af børn og unge, mod et succeskriterium på aftale med 5 idrætsklubber.

Projektet har på resultatniveau opfyldt de to fastsatte succeskriterier: Status er at 23 børn og unge har meldt sig ind i en forening, mod et succeskriterium på 15 børn og unge. Det er 13 børn og unge, der er fastholdt i foreningerne, mod et succeskriterium på 10 fastholdte børn og unge.

Vurdering: Projektets fremdrift er god. Projektstatus er grøn.

2. Titel på projektet: Alle for én – fokus på familien og en bedre fremtid for børnene på ydre Nørrebro**Om projektet:**

Projektets hovedformål er at udvikle en social indsats, der kan understøtte det overordnede mål om at børn fra socialt belastede hjem opnår ligeså gode skoleresultater som byens børn generelt. Målgruppen udgør cirka 125 børn med svære sociale vilkår i deres hjem på ydre Nørrebro.

Projektholder: Rådmandsgades Skole

Bevillingsgivende pulje: Den tværgående integrationspulje

Forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

Budgetramme: Kommunal finansiering: Den tværgående integrationspulje 437.500 kr. i alt. 2008:35.000 kr. 2009:210.000 kr. 2010:192.500 kr. Børne- og Ungdomsforvaltningen 62.500 kr.

Andre kilder: Integrationsministeriet 500.000 kr. Bikube 1.100.000 kr.


Projektperiode: Startdato 8. sep. 2009. Slutdato 25. juli 2011

Fremdrift:

Projektet har god fremdrift i henhold til milepælsplanen. Projektet har på aktivitetsniveau opfyldt de fastsatte succeskriterier, idet der i 3. kvartal 2010 er afholdt to arrangementer og udarbejdet en midtvejsevaluering.

Projektet har på resultatniveau opfyldt det fastsatte succeskriterium: Midtvejsevalueringen viser at socialrådgivere, PPR-repræsentanter, sundhedsplejersker, AKT-lærere og klasselærere vurderer forældrenes udbytte til at være gennemsnitligt 8,26 ud af 10 mulige (se også diagram herunder) - det opstillede succesmål er 7,5 ud af 10. De vurderer, at forældrene i høj grad har fået viden om henvendelsesmuligheder, større kendskab til lokale tilbud, er blevet bedre til at tackle forælderrollen og blevet mere aktive i skabelsen af et godt liv for deres barn.

Tabel fra midtvejsevaluering af Åben skole, Navigent august 2010.

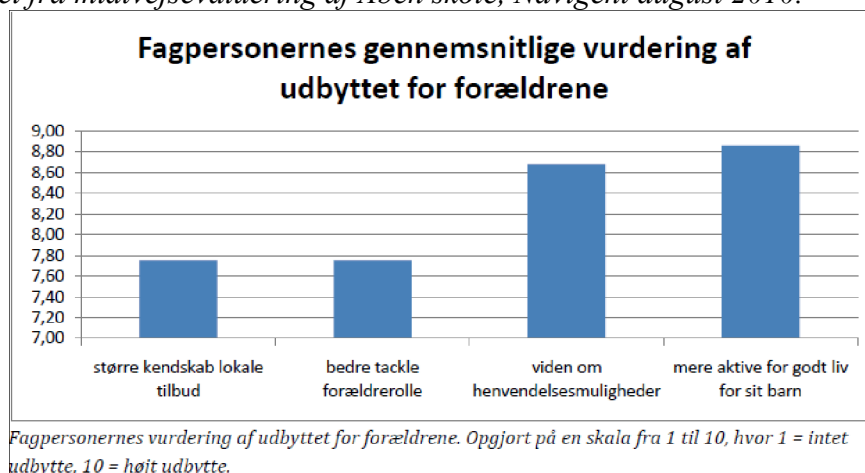

Vurdering: Projektets fremdrift er god. Projektstatus er grøn.

3. Titel på projektet: Integration, fastholdelse, rekruttering og netværk

Om projektet:

Nørrebro United er en fodboldklub på Nørrebro, som har 75 børne- og ungemedlemmer, hvoraf ca. 80 % har anden etnisk baggrund end dansk.

Formålet med projektet er 1) at øge de lokale børns sundhedsmæssige, sociale og alment dannende udvikling, 2) at lave en bæredygtig klub med fodbold som omdrejningspunkt og 3) at skabe en positiv udvikling på Nørrebro.

Projektholder: Nørrebro United

Bevillingsgivende pulje: Brobygningpuljen

Forvaltning: Kultur- og Fritidsforvaltningen

Budgetramme: 2009: 37.500 kr. 2010: 150.000 kr. 2011: 112.500 kr.

Projektperiode: Startdato 1. oktober 2009. Slutdato 1. oktober 2011

Fremdrift:

Projektet har meget god fremdrift i henhold til milepælsplanen.

Projektet har på aktivitetsniveau opfyldt alle de fastsatte succeskriterier: Bl.a. har projektet opstartet 3 nye hold for de 5—8 årige mod et succeskriterium på 1 nyt hold. Projektet har på resultatniveau opfyldt de fastsatte succeskriterier: ca. 70 % af medlemmerne har anden etnisk baggrund end dansk mod et succeskriterium på 70 %. Der er rekrutteret 7 frivillige i dette kvartal mod et succeskriterium på at rekruttere 4 frivillige.

Vurdering: Projektets fremdrift er god. Projektstatus er grøn.

4. Titel på projektet: Projekt Bydelsmødre og Kvinde-ambassadører i Akacieparken og på Bispebjerg

Om projektet:

Projektet har overordnet til formål at aktivere kvinder med anden etniske baggrunds ressourcer til gavn for dem selv, deres børn, ægtefælle og samfundet. Delformål i forbindelse hermed er blandt andet at styrke målgruppens kontakt til kommunen og fremme beskæftigelsesmulighederne samt at antallet af socialt isolerede familier med etnisk minoritetsbaggrund reduceres.

Projektholder: Socialforvaltningen

Bevillingsgivende pulje: Den tværgående Integrationspulje

Forvaltning: Socialforvaltningen /Kultur- og Fritidsforvaltningen

Budgetramme: Kommunal finansiering 1.366.500,00 kr. (den 14. maj 2008 BIU 95/2008) 2008: 195.513, 2009: 780.852 og 2010: 390.135

Projektperiode: Startdato 1. nov. 2008. Slutdato 31. dec. 2010.

Fremdrift:


Projektet har god fremdrift i henhold til milepælsplanen.

Projektet har på aktivitetsniveau opfyldt de fastsatte succeskriterier:

Bydelsmødre i Bispebjerg har lavet ca. 270 besøg pr. 1. okt., og 80 antal besøg pr. 1. okt. i Akacieparken. Der har været lidt mindre aktivitet i 3. kvartal, da to bydelsmødre har været på barsel og der har været ramadan, men det vurderes ikke at påvirke projektets overordnede tidsplan.

Der er afholdt månedlig supervision af bydelsmødrene. På konferencen d. 6. okt. 2010 blev der afholdt en særskilt workshop om metoder i bydelsmødre arbejdet.

Der bliver aktuelt udarbejdet en evaluering af Socialforvaltningen. Evaluering vil beskrive præcist hvor mange unikke familier projektet har besøgt og om projektet har opfyldt sine succeskriterier. Evalueringen er klar i december 2010.

Vurdering: Projektets fremdrift er god. Projektstatus er grøn. 

Forankring: Der i øjeblikket nedsat en arbejdsgruppe bestående af BM Projekt Bispebjerg/Akacieparken (KBH Kommune), BM Projekt Vollsmose, BM Projekt Århus (Dansk Flygtningehjælp), som arbejder på etableringen af et landsnetværk, der skal arbejde for forankring af bydelsmorprojekterne på landsplan. Som det ser ud på nuværende tidspunkt er der udarbejdet landsdækkende hjemmeside, som i øjeblikket fungerer som fælles platform for videndeling og kontakt projekterne imellem samt til andre interessenter. Desuden arbejder arbejdsgruppen med en model, hvor bydelsmorprojekterne på landsplan samles og forankres under Fonden For Socialt Ansvar (som bl.a. har natteravnene).

5. Titel på projektet: Fælles evaluering af Bydelsmødre

Om projektet: Projektet evaluerer og dokumenterer resultaterne af projekt "Bydelsmødre", som indbefatter selvstændige projekter på henholdsvis Nørrebro, Bispebjerg/ Akacieparken, Tingbjerg og Sjælør/ Kgs. Enghave.

Projektholder: Socialforvaltningen

Bevillingsgivende pulje: Den tværgående Integrationspulje
Forvaltning: Socialforvaltningen/Kultur- og Fritidsforvaltningen
Budgetramme: kommunal finansiering 500.000 kr.
Projektperiode: Startdato 1. sep. 2008. Slutdato 31. dec. 2010.
<p>Fremdrift: Projektet har god fremdrift ifølge milepælsplanen, idet de planlagte aktiviteter overordnet skrider fremad som planlagt. Siden sidste statusrapport er den afsluttende rapport vedr. Sjælør/Kgs. Enghave afsluttet og den afsluttende rapport vedr. Akacieparken/Bispebjerg ved at være tilendebragt. De foreløbige resultater fremlægges på en landsdækkende bydelsmødre konference 6.10.2010 i en workshop.</p> <p>For så vidt angår telefonundersøgelsen er alle spørgeskemaer nu indtastet. De kvantitative data fra telefonundersøgelsen vil blive brugt sammen med kvalitative data fra evalueringen af de enkelte projekter til at sandsynliggøre projekternes succeskriterier. Samtidig kan resultaterne fra telefonundersøgelsen anvendes i forhold til belyse resultaterne af bydelsmødre indsatsen på tværs af projekterne i København.</p>
<p>Vurdering: Projektets fremdrift er god. Projektstatus er grøn. </p>

6. Titel på projektet: SFK – Satellit Floorball KBH
<p>Om projektet: Dette projekt er en etablering af satellitklubber i lokale boligområder, hvor især børn og unge, som ikke er typiske foreningsmedlemmer bliver en del af en række sportslige aktiviteter. Formålet med projektet er i forlængelse heraf, at der bliver skabt et samlingspunkt hvor målgruppen får nye sociale netværk, møder nogle voksne rollemodeller og får en række positive oplevelser.</p>
Projektholder: Valby Floorball Club
Bevillingsgivende pulje: Brobygningspuljen
Forvaltning: Kultur- og Fritidsforvaltningen
<p>Budgetramme: Brobygningspuljen: 200.000 kr. til perioden: 1. august 2009 – 1. august 2011. 2009: 41.667 kr. 2010: 100.000 kr. 2011: 58.333 kr. Anden finansiering: 90.000 kr. Tuborg fonden (ansøgt), 15.000 kr. Valby Lokaludvalg (ansøgt) 15.000 kr. Projekt Idræt på Gaden, Sommerfloorballskole, Helhedsplanen Sjælør Boulevard (alle bevilget)</p>
Projektperiode: Startdato 1. august 2009. Slutdato 1. august 2012

Fremdrift:

Projektet har god fremdrift i henhold til milepælsplanen. Projektet har på aktivitetsniveau opfyldt de fastsatte succeskriterier.

Projektet har på resultatniveau opfyldt de fleste succeskriterier. Der er rekrutteret 10 frivillige mod et succeskriterium på 20 frivillige. Dette skyldes frafald blandt de frivillige, men projektet bekræfter at der er nye frivillige på vej ind i projektet. Der er skabt kontakt til 220 børn mod et succeskriterium på kontakt til 60 børn. Der er skabt kontakt til 26 børn med anden etnisk baggrund end dansk, mod et succeskriterium på 30 børn. Dette skyldes at der er lidt frafald, når projektet stiller krav om kontingentbetaling.

Projektet arbejder på at skaffe faciliteter, dvs. et fast træningssted for klubben.

Vurdering: Projektets fremdrift er god. Projektstatus er grøn.

**7. Titel på projektet: Integrationsmedarbejdere i bibliotekerne****Om projektet:**

Formålet med dette projekt er at udvikle og opkvalificere Københavns bibliotekers tilbud til borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Dette sker gennem oprettelse af nye, innovative læringscentre og andre formidlingstilbud hvor bibliotekerne ønsker at bidrage til en bedre integration. Igangsættelsen af tilbuddene sker af ledige, højtuddannede med en anden etnisk baggrund end dansk, der skal virke som rollemodeller, samtidig med at de gennem arbejdet forbedrer deres kompetencer, så de efterfølgende kan opnå beskæftigelse.

Projektholder: Vesterbro Bibliotek

Bevillingsgivende pulje: Den tværgående integrationspulje

Forvaltning: Kultur- og Fritidsforvaltningen

Budgetramme: Tilskud fra Den tværgående integrationspulje 2,4 mio. kr.
2008: 600.000 kr. 2009: 900.000 kr. 2010: 900.000 kr.

Projektperiode: Startdato 1. januar 2008. Slutdato 31. december 2010

Fremdrift:

Projektet har meget god fremdrift i henhold til milepælsplanen.

Sammenlignet med de forventede resultater for læringstilbud, formidling samt opsøgende aktiviteter ligger de opnåede resultater langt over de fastsatte succeskriterier. Der er dog en undtagelse hvad angår antallet af sociale og kulturelle arrangementer. Det lavere antal sociale og kulturelle arrangementer forklarer projektet med, at det har vist sig, at der er større efterspørgsel efter andre aktiviteter, hvorfor de sociale og kulturelle arrangementer er blevet nedprioriteret.

Der har været 632 deltagere i sociale og kulturelle arrangementer mod et succeskriterium på 1000, dog var det oprindelige succeskriterium for antal deltagere på 270. Der har været 764 deltagere til læringstilbud mod et succeskriterium på 100. Projektet har fået 1211 deltagere i forbindelse med diverse formidling mod et succeskriterium på 400.

Vurdering: Projektets fremdrift er god. Projektstatus er grøn.



8. Titel på projektet. Copenhagen Budo Academy

Om projektet:

Copenhagen Budo Academy er en karateklub, der startede i sommeren 2008. Klubben havde ved projektstart ca. 25 voksenmedlemmer, 50 børn/unge medlemmer og 6 frivillige tilknyttet. Da klubben har kapacitet til flere medlemmer er målet med projektet, at der skal rekrutteres børn og unge fra lokalområdet, ligesom der skal sikres fastholdelse af allerede eksisterende medlemmer. Derudover er målet, at der arbejdes med klubben som tilholdssted for de unge, med opdragelse i filosofien bag karate, med forældresamarbejde og etablering af lektiehjælp.

Projektholder: Copenhagen Budo Academy

Bevillingsgivende pulje: Brobygningspuljen og Integration (Teknik og Miljø forvaltningen)

Forvaltning: Kultur- og Fritidsforvaltningen

Budgetramme: Brobygningspuljen har bevilliget 270.000 i 2009 til perioden 1. august 2009 – 1. januar 2011

Integrationspuljen, (Teknik og Miljø Forvaltningen): 70.000 kr. Derudover stilles en ramme på yderligere 27.000 kr. til rådighed til kontingenthjælp.

Projektperiode: Startdato 1. august 2009. Slutdato 1. januar 2011.

Fremdrift:

Projektet vurderes til at have fremdrift i henhold til milepælsplanen. Projektet har ved 3. kvartal i 2010 rekrutteret omkring 60 nye medlemmer hvor målet er, at der ved endt projektperiode skal være rekrutteret 100 nye medlemmer under 25 år - hvoraf 80 har etnisk minoritetsbaggrund. Samlet er der i dag ca. 100 medlemmer af foreningen. De arbejder på at få børnene og de unge til at betale kontingent mere stabilt. Efter sommerferien har der desuden været en del arbejde med at kontakte nogle af medlemmerne, for at sikre, at de kom igen efter ferien. Derudover er der opstartet et samarbejde med Red barnet ungdom, som tilbyder lektiehjælp i forenings lokaler hver mandag. Samtidig er moderen til en af medlemmerne stadigvæk ansat til at tage imod børnene når de kommer til træning samt snakke med børnenes forældre. D. 15. november starter der et nyt begynderhold således at flere børn og unge vil få mulighed for at få træning. I den forbindelse er det planlagt at tage ud til flere lokale skoler ligesom foreningen arbejder på at komme i TV 2 Lorry.

Vurdering: Projektets fremdrift er god. Projektstatus er grøn.



9. Titel på projektet: ForeningsGuideQ

Om projektet:

Formålet er, at etniske minoritetskvinder i udsatte boligområder bliver uddannet inden for foreningsliv og kommer til at arbejde som frivillige guider, hvor de skal rådgive og guide andre minoritetskvinder og børn ud i det folkeoplysende foreningsliv. Via et uddannelsesforløb i foreningsliv, frivilligt arbejde og formidling bliver kvinderne eksperter i opsøgende arbejde og guidning af andre kvinder og børn i deres bydel.

Projektholder: Integration & Fritid

Bevillingsgivende pulje: Den tværgående integrationspulje

Forvaltning: Kultur- og Fritidsforvaltningen

Budgetramme: Samlet budget: 1.529.280 kr, heraf kommunal finansiering på 529.280 kr.: Den tværgående integrationspulje: 317.568 kr. Kultur- og Fritidsforvaltningen: 211.280 kr.

Anden finansiering: Integrationsministeriets pulje: ”Nydanske kvinders ressourcer i fokus”: 1.000.000 kr.

Projektperiode: Startdato: 1.maj 2009. Slutdato: 1. maj 2012

Fremdrift:

Projektet har god fremdrift i henhold til milepælsplanen. Projektet har på aktivitetsniveau opfyldt de fastsatte succeskriterier. Der er bl.a. tilmeldt 22 kvinder til et nyt kursusforløb, mod et succeskriterium på 5 kvinder tilmeldt.

Projektet har på resultatniveau opfyldt alle succeskriterier. Der er aktuelt 20 aktive guider mod et succeskriterium på 12 aktive guider. Projektet har lavet 105 guideforløb mod et succeskriterium på 25. (Guideforløb dækker over: guidning pr. Tlf., personligt møde, og at følge barnet/kvinden hen til foreningen samt guidning af større grupper.)

Vurdering: Projektets fremdrift er god. Projektstatus er grøn.

**10. Titel på projektet: Nørrebro Bydelsprojekt – mangfoldighed, og delagtighed i Københavns historie****Om projektet:**

Sigtet med Nørrebro Bydelsprojekt er at undersøge og forstå de livskvaliteter, der holder en bydel sammen, og at skabe mangefacetterede, positive og komplekse billeder af bydelen, med tilsvarende mangfoldige identifikationsmuligheder. Det er således også et mål, at borgere, der kan have oplevet sig som udenfor og marginaliserede, ser sig selv som værdifulde og inkluderede ved at deres historier, fortolkninger og kompetencer bliver synliggjorte som del af hovedstadens fælles kulturarv. www.copenhagen.dk

Projektholder: Københavns Museum

Forvaltning: Kultur og Fritidsforvaltningen

Bevillingsgivende pulje: Den tværgående integrationspulje
Budgetramme: Samlet budget kr. 1.393.700 Kommunal finansiering heraf kr. 424.000. Kulturministeriet: 546.000 kr. Den resterende finansiering udgøres af museets egenfinansiering.
Projektperiode: Startdato: 15. dec. 2009. Slutdato: 15.dec. 2010
<p>Fremdrift: Projektet har god fremdrift i henhold til milepælsplanen. Projektet har på aktivitetsniveau opfyldt næsten alle de fastsatte succeskriterier. 90 % af de unge, der er ansat i projektet, er fastholdt i projektet. Der er afholdt tre events mod et succeskriterium på tre afholdte events. 50 % af de unge deltager i udviklingen af en udstilling "At blive Københavner" og bidrager med materiale, stemmer og flerkulturelle kompetencer. De unge har bemanded væggen ugentlig siden åbningen i april, bortset fra under sommerferien.</p>
<p>Vurdering: Projektets fremdrift er god. Projektstatus er grøn. </p>
