Lemming & Erikaaon
Rådgivende Ingeniører a.s FRI

L&E sag nr. 3545

Vandkulturhus i Valby Idrætspark

Hovedtidsplan for fremskudt udbud i hoved- eller storentrepriser

9. januar 2008

Id	Opgavenavn	Varighed
1		
2	**Totalrådgivning og fremskudt udbud**	768 dage?
3	**Udbud af totalrådgivning**	**39 dage?**
13	**Tilbud og kontrakt med totalrådgiver**	**61 dage?**
17	**Projektering**	**285 dage?**
18	Energiprogram	25 dage?
19	Dispositionsforslag	50 dage
20	BH - Godkendelse af dispositionsforslag	10 dage
21	Projektforslag	60 dage?
22	BH - Godkendelse af projektforslag	10 dage
23	Myndighedsprojekt	60 dage
24	Myndighedsfase / Byggetilladelse	80 dage
25	Udbudsprojekt	70 dage
26	**Udbud og entreprisekontrakter**	**247 dage?**
27	BH - Udbudsbekendtgørelse og henvendelser	40 dage
28	BH - Prækvalifikation og udsendelse	10 dage
29	Tilbudsfase og licitation	40 dage?
30	Licitation	1 dag?
31	BH - Evaluering af tilbud + kontraktforhandlinger	15 dage
32	Bearbejdning af tilbudsprojekt / Tilpasninger	20 dage
33	BH - Entreprisekontrakt(er)	1 dag?
34	Hoved- og leverandørprojekt	120 dage
35	**Udførelse**	**321 dage?**
36	Byggeledelse og fagtilsyn	300 dage
37	BH - Udbud og installation af bygherreleverancer	180 dage
38	Ibrugtagning	1 dag?

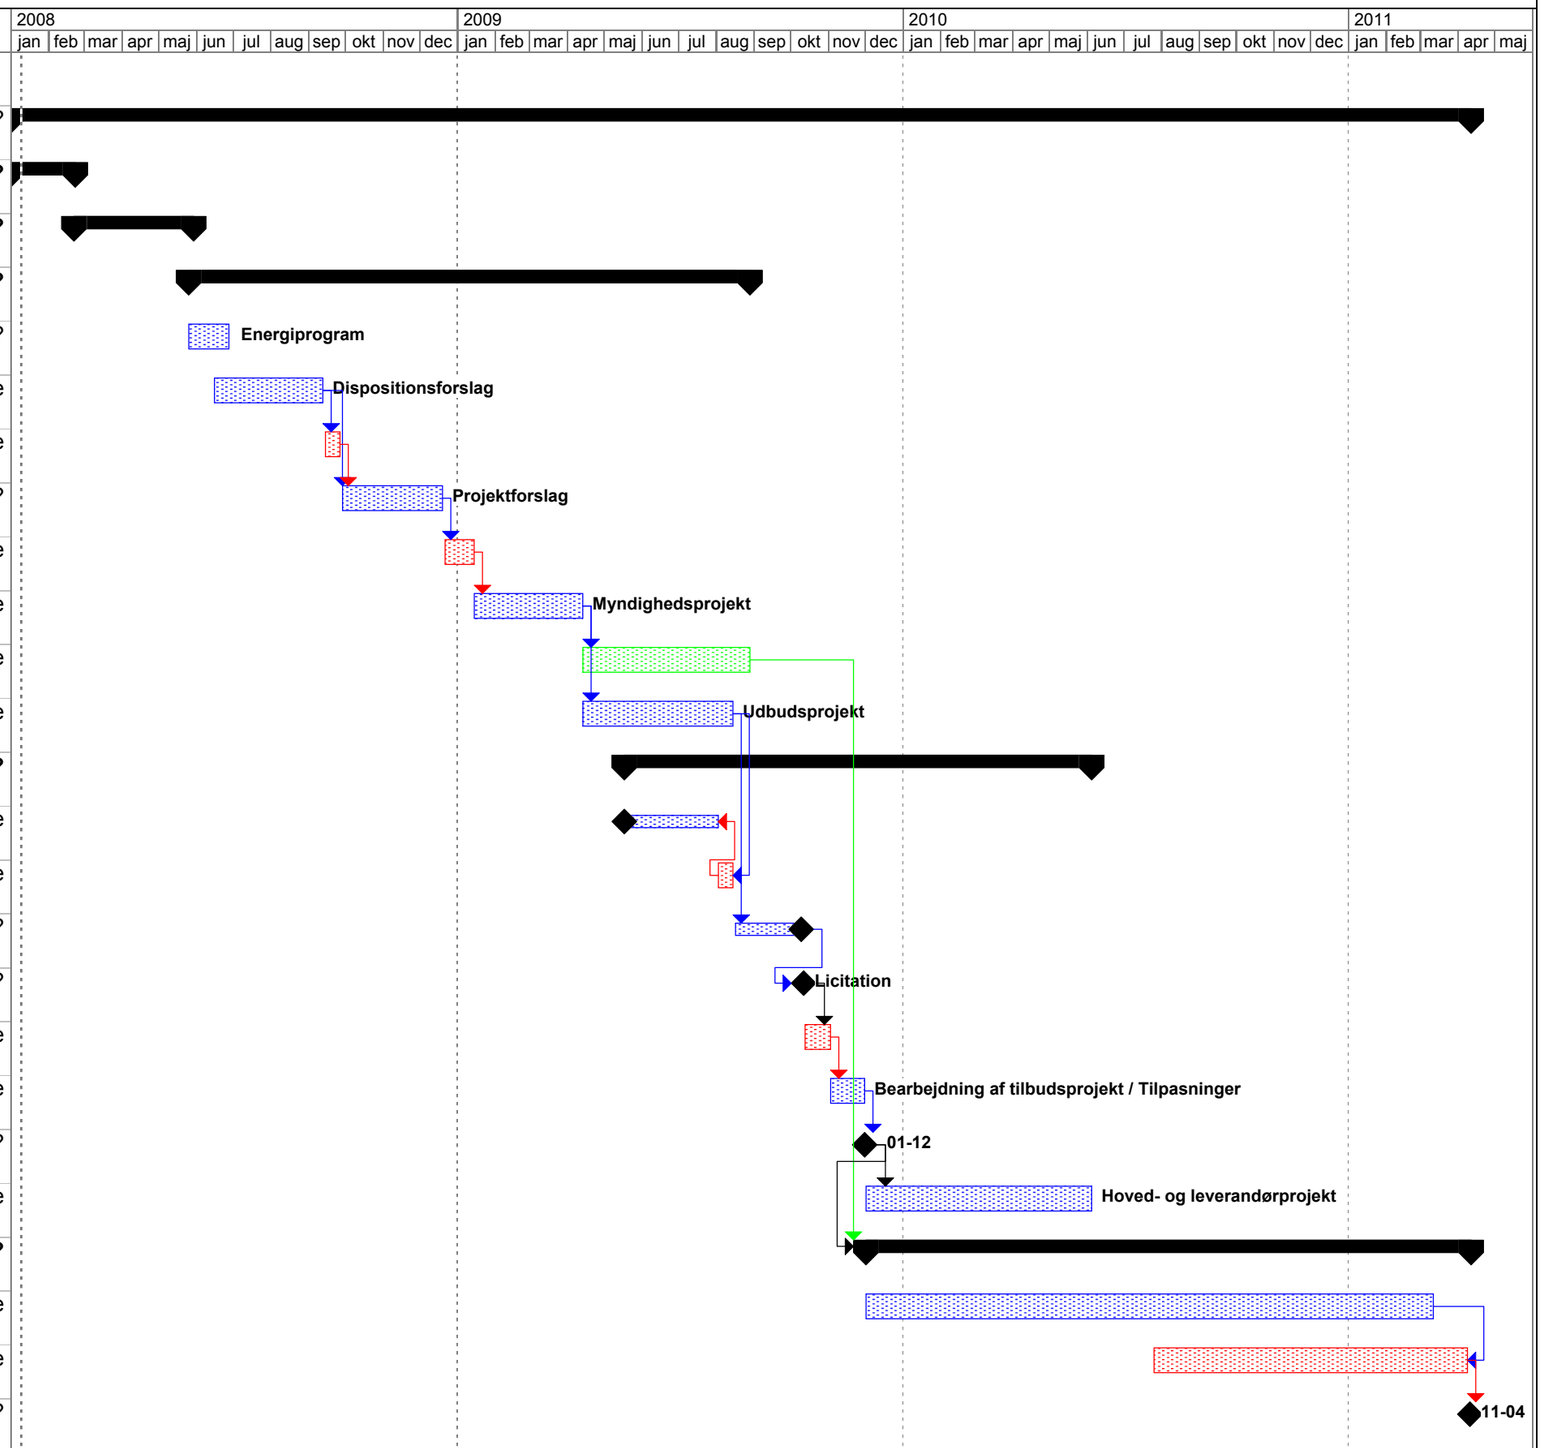

2008-01-08 - Hovedtidsplaner
Dato: on 09-01-08

Opgave | Fremdrift | Oversigt | Eksterne opgaver | Deadline
Opdeling | Milepæl | Projektoversigt | Ekstern milepæl
