| Id | Opgavenavn | Varighed | Startdato | Slutdato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Fælledklubhus** | **826 dage?** | **ma 31-12-07** | **fr 25-02-11** |
| 2 | | | | |
| 3 | **Programmering / forarbejder** | **176 dage?** | **ma 31-12-07** | **ma 01-09-08** |
| 4 | Programmering afsluttes - aflevering til KEjd | 176 dage? | ma 31-12-07 | ma 01-09-08 |
| 5 | | | | |
| 6 | **Udbud - Bygherrerådgivning for KEjd** | **20 dage?** | **ma 04-08-08** | **fr 29-08-08** |
| 7 | Udbud af bygherrerådgivningsopgave | 20 dage? | ma 04-08-08 | fr 29-08-08 |
| 8 | | | | |
| 9 | **Prækvalifikation** | **131 dage?** | **fr 09-05-08** | **fr 07-11-08** |
| 10 | Udarbejdelse af Udbudsbekendtgørelse | 10 dage? | ma 01-09-08 | fr 12-09-08 |
| 11 | Afsendelse af udbudsbekendtgørelse | 0 dage | fr 09-05-08 | fr 09-05-08 |
| 12 | Frist for anmodning om deltagelse | 30 dage | ma 15-09-08 | fr 24-10-08 |
| 13 | Prækvalifikation - valg af deltagere | 10 dage | ma 27-10-08 | fr 07-11-08 |
| 14 | | | | |
| 15 | **Udbud** | **40 dage?** | **ma 15-09-08** | **fr 07-11-08** |
| 16 | Udarbejdelse af Udbudsmateriale | 36 dage | ma 15-09-08 | ma 03-11-08 |
| 17 | Godkendelse, færdiggørelse og trykning af program | 5 dage? | ma 03-11-08 | fr 07-11-08 |
| 18 | | | | |
| 19 | **Totalentreprisekonkurrence** | **96 dage** | **ma 10-11-08** | **fr 20-03-09** |
| 20 | Udsendelse af konkurrenceprogram | 0 dage | ma 10-11-08 | ma 10-11-08 |
| 21 | Totalentreprisekonkurrence | 71 dage | ma 10-11-08 | fr 13-02-09 |
| 22 | Bedømmelse af forslag | 10 dage | ma 16-02-09 | fr 27-02-09 |
| 23 | Orientering af politisk udvalg og brugerudvalg | 15 dage | ma 02-03-09 | fr 20-03-09 |
| 24 | | | | |
| 25 | **Totalentreprise** | **505 dage?** | **ma 23-03-09** | **fr 25-02-11** |
| 26 | **Forslag og projektering** | **265 dage?** | **ma 23-03-09** | **fr 26-03-10** |
| 27 | Projektforslag | 75 dage | ma 23-03-09 | fr 03-07-09 |
| 28 | Forprojekt (Myndighedsprojekt) | 15 dage | ma 15-06-09 | fr 03-07-09 |
| 29 | Myndighedsbehandling (Center for Byggeri) | 66 dage | fr 03-07-09 | fr 02-10-09 |
| 30 | Hovedprojekt | 170 dage? | ma 03-08-09 | fr 26-03-10 |
| 31 | **Udførelse** | **235 dage** | **ma 05-04-10** | **fr 25-02-11** |
| 32 | Byggeperiode | 220 dage | ma 05-04-10 | fr 04-02-11 |
| 33 | Aflevering og ibrugtagning | 15 dage | ma 07-02-11 | fr 25-02-11 |
| 34 | | | | |
| 35 | **Lokalplanproces (Center for Bydesign)** | **351 dage** | **ma 24-11-08** | **fr 26-03-10** |
| 36 | Udarbejdelse af planforslag | 76 dage | ma 24-11-08 | fr 06-03-09 |
| 37 | Behandling og godkendelse af planforslag | 275 dage | ma 09-03-09 | fr 26-03-10 |

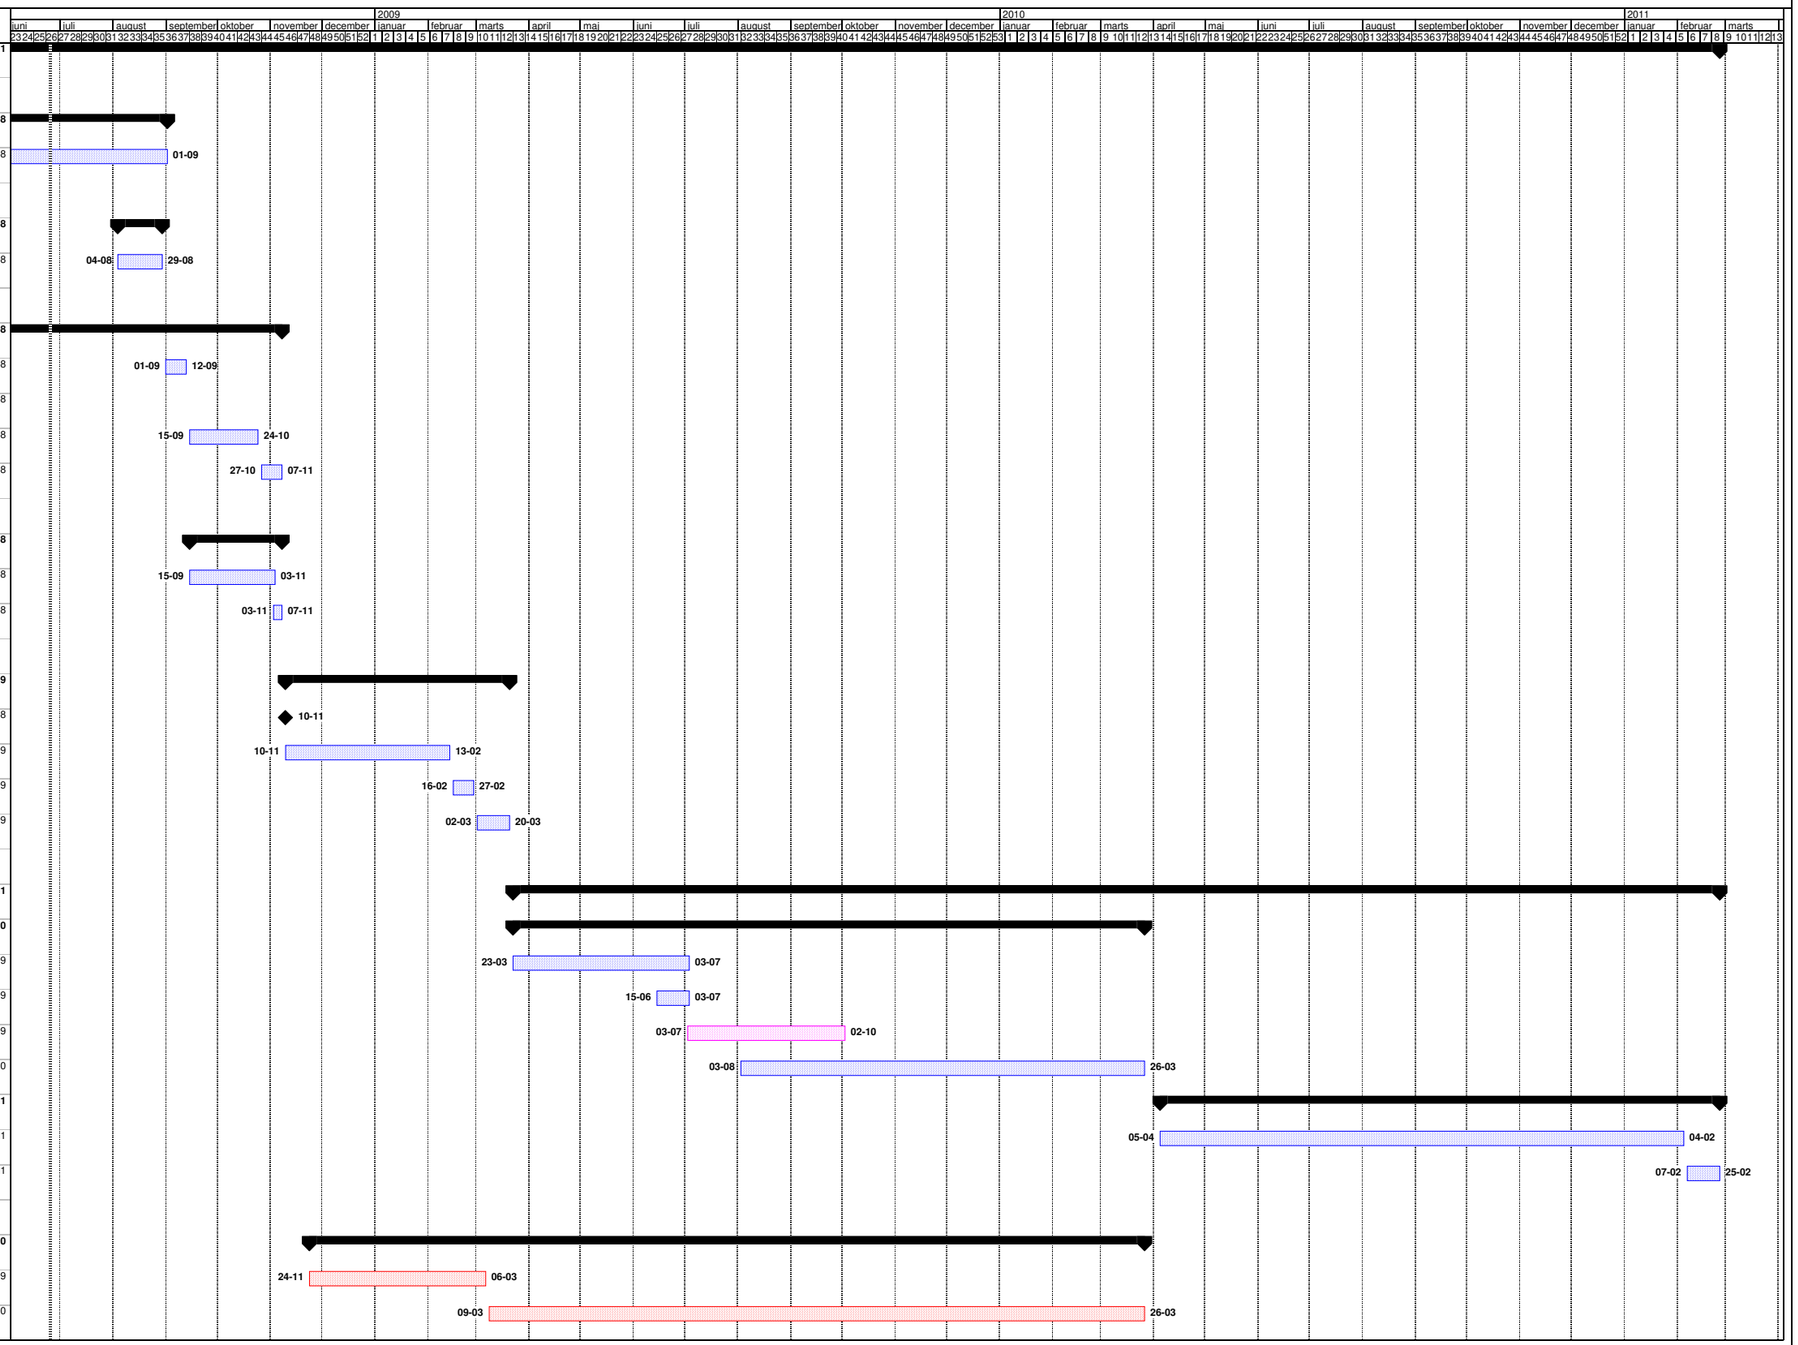


Projekt: Hovedtidsplan
Dato: on 25-06-08

Opgave | Milepæl | Opløftet opgave | Opløftet fremdrift | Eksterne opgaver | Grupper efter oversigt
Fremdrift | Oversigt | Opløftet milepæl | Opdeling | Projektoversigt | Deadline
