



Bilag 8

25-02-2013

Eksekvering af anlægssager i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sagsnr.
2013-40797

Anlægsoversigten 1. kvartal 2013 viser at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har 26 anlægssager, heraf er 4 grønne, 3 gule og 19 røde.


Dokumentnr.
2013-170364

Af de 19 røde anlægssager, er 9 forsinket som følge af anlægsloftet i 2013. Det bør bemærkes, at der totalt for Københavns Kommune er 12 sager som udskydes som følge af anlægsloftet, heraf ligger de 9 i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Sagsbehandler
Per Christensen

3 IT-projekter er forsinket som følge af interne faktorer/for optimistisk tidsplan. Koordinering med andre projekter har forsinket 2 sager, hvoraf 1 sag er et IT projekt og 1 sag der har afventet beslutning vedrørende Helhedsplanen for De gamles By.

Endelig er 5 sager forsinket som følge af lang myndighedsbehandling, forhandlinger og/eller konkurser hos 3. mand/entreprenør, samt driftshensyn i forhold i enhederne (primært etablering af yderligere servicearealer eller produktionskøkkener på eksisterende plejecentre, hvor byggeaktiviteterne skal indpasses i forhold driften af centrene).

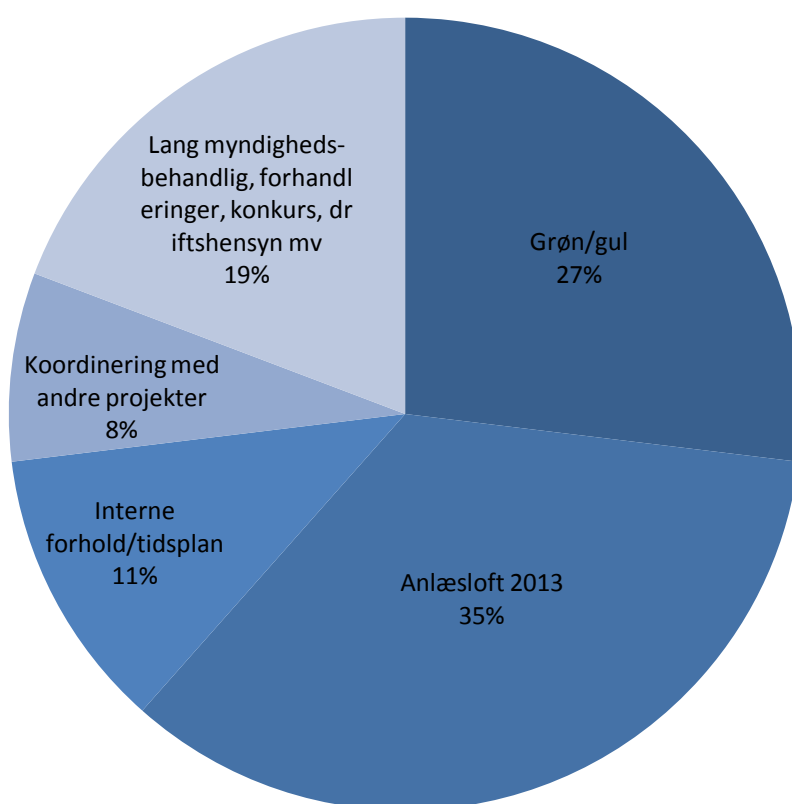

Af de 7 sager der er forsinket som følge af koordinering med andre sager samt øvrige eksterne forhold, er der 3 byggesager hvor anlægsarbejdet er i fuld gang og pågår efter revideret tidsplan, 1 hvor der pt. er udbud samt 3 IT-projekter hvor udviklingssatsen er intensiveret.
