

Årlig status på Ressource- og Affaldsplan 2018

Borgerrepræsentationen vedtog den 13. december 2012 Ressource- og Affaldsplan 2018, der gælder for perioden 2013-2018. Ved planens godkendelse indgik det, at der én gang årligt skal fremlægges en status på implementeringen af planen for Teknik- og Miljøudvalget.


Mål og initiativer i Ressource- og Affaldsplan 2018 har været fremlagt for Teknik- og Miljøudvalget den 9. september 2013 og er præsenteret for det nyvalgte Teknik- og Miljøudvalg den 20. januar og 3. februar 2014.

Planens overordnede målsætning er, at Københavns Kommune skal udnytte affaldet bedre, så flest mulige ressourcer genanvendes og mindst muligt affald forbrændes. Målet er at reducere mængden af affald til forbrænding med 20 % og sikre at mindst 45 % af husholdningsaffaldet bliver genanvendt i 2018.

Intentionerne i Ressource- og Affaldsplan 2018 er i overensstemmelse med regeringens Ressourcestrategi, som blev udsendt i oktober 2013. Strategien sigter mod mere genanvendelse og mindre forbrænding og at 50 % af husholdningsaffaldet genanvendes i 2022.


Status på affaldsmængderne

Mængden af husholdningsaffald til forbrænding er faldet med 17.600 ton i perioden 2010 til 2013 (se figur 1).

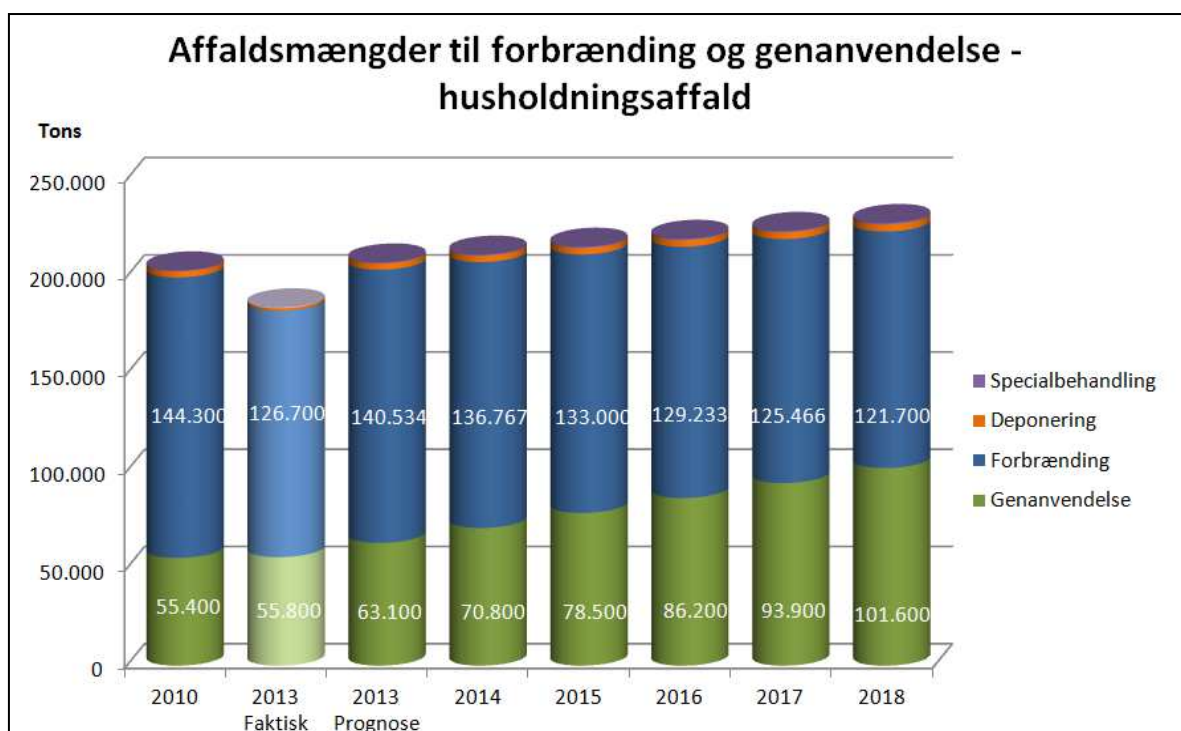

Figur 1: Figuren viser en prognose for udviklingen i husholdningernes affaldsmængder. I forhold til forventningerne om en stigning i affaldsmængderne er der i stedet sket et samlet fald på 9,4 % fra 2010 til 2013. Faldet har også haft konsekvenser for forventningen om 63.100 tons til genanvendelse i 2013.

I samme periode er mængderne til genanvendelse fastholdt på samme niveau - dvs. 55.800 tons om året. Samlet set betyder det, at genanvendelsen er steget fra 27 % til 30 %, hvilket ligger meget godt i tråd med den udvikling, der bør være for at nå målet i 2018 (se figur 2).

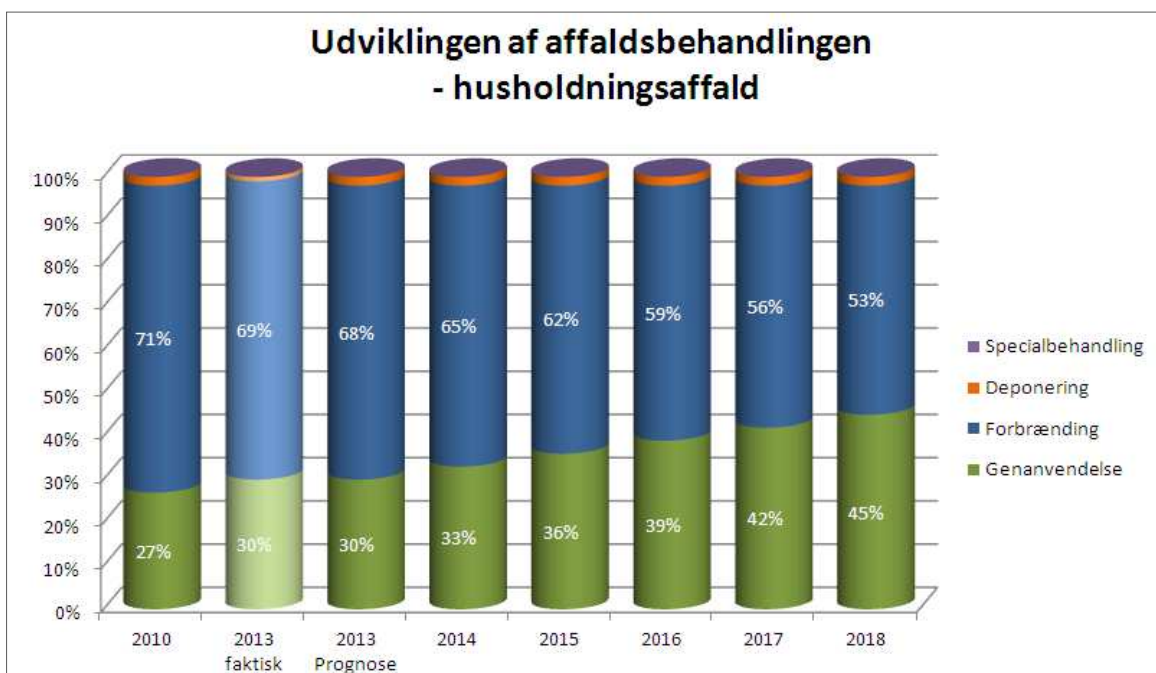

Figur 2: Figuren viser en prognose for fordelingen mellem behandlingsformer for husholdningsaffald frem til 2018, jf. målet for Ressource- og Affaldsplan 2018. Det ses, at udviklingen for 2013 følger prognosen.

Forhold, der især har haft betydning for udviklingen:

- Mængden af husholdningsaffald er faldet med 9,4 % fra 2010 til 2013, svarende til 34 kilo pr. indbygger. Faldet formodes bl.a. at hænge sammen med følgevirkninger af finanskrisen. Det er også muligt, at tendensen til mere genbrug, fx af møbler, er ved at slå igennem. I Københavns Kommune foregår direkte genbrug bl.a. via genbrugsstationernes byttecentre og ved events såsom ”Store Byttedag”.
- På genbrugsstationerne er mængden af træ, der går til genanvendelse i spånpladeproduktion steget markant med over 6.000 tons om året.
- Mængden af indsamlet papir til genanvendelse er faldet, men der har samtidig også været et generelt mindre forbrug af papir. Tendensen understreges af, at flere og flere husstande tilmelder sig ”Nej-tak til reklamer” og faldende avisoplag. I 2011 sagde ca. 45 % af husstandene i Københavns Kommune ”Nej-tak til reklamer”, mens tallet lå på omkring 50 % i 2012.

I forhold til udviklingen i erhvervsaffaldet er det ikke muligt at få valide data. I 2010 overtog Miljøstyrelsen opgaven med at indsamle affaldsdata fra kommunerne, men dataene i Miljøstyrelsens nationale database er endnu ikke tilstrækkeligt gode til at kunne benyttes. Miljøstyrelsen har iværksat et bredt samarbejde med affaldsbranchen for at forbedre kvaliteten af data.

Status på initiativerne

Kommunens mål skal opnås gennem en række initiativer. Initiativerne er fordelt på følgende fire temaer: 1) Mindre affald, 2) Bedre sortering fra borgere og erhverv, 3) Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling og 4) Bedre affaldsbehandling.

Mange initiativer er påbegyndt i 2013, men ikke afsluttet, hvilket medfører, at de konkrete effekter først vil afspejles i affaldsmængderne senere. I bilaget findes en kort gennemgang af

status på samtlige initiativer. Nedenfor er fremhævet eksempler på initiativer, der er gennemført eller godt i gang:

Tema 1. Mindre Affald

- Initiativ nr. 3: Genbrug af mursten. I forbindelse med tilsyn er hele mursten fra nedrivningsprojekter blevet anvist til direkte genbrug. Desuden har et forsøg i samarbejde med Amager Ressourcecenter og virksomheden ”Gamle Mursten” givet genbrugsstationernes kunder mulighed for at sortere mursten. Det viser sig, at 60-65 % af murstenene kan genbruges i nye byggeprojekter. ”Gamle Mursten” har i 2013 modtaget 3.689 ton mursten.
- Initiativ nr. 5: Mindre madspild fra husholdninger. Er igangsat i 2013 i stedet for 2014. Der er gennemført et projekt for mindre madspild på et kollegium og en skole. Projektet har bl.a. vist, at holdningen til madspild kan ændres ved, at der sættes fokus på det. Udgiften på 51.000 kr. har været afholdt i 2013, et år før planlagt.

Tema 2. Bedre sortering fra borgere og erhverv

- Initiativ nr. 8: Beholdere til plast, metal og småt elektronik. Over det sidste halvandet år er der leveret affaldsbeholdere til de tre fraktioner til etageboliger i det meste af byen – samlet set 23.000 affaldsbeholdere. Den årlige indsamlede mængde af plast og metal til genanvendelse er som følge heraf steget fra 77 ton i 2012 til 581 ton i 2013.
- Initiativ 13, 14 og 15: Villakoncept. Teknik- og Miljøudvalget har den 21. oktober 2013 vedtaget, at også villaer fra 1. marts 2015 skal have beholdere til plast og metal som en del af et samlet affaldskoncept til villaer. Konceptet omfatter også øget service ved afhentning af affald, og at man kan få opstillet en beholder til pap og/eller organisk affald, hvis det ønskes. Som en konsekvens af at udbuddene er blevet udskudt med et halvt år, rykkes ikrafttrædelsen til 1. september 2015.
- Københavnernes sorterer. Der er udarbejdet en incitamentsbaseret takstmodel, så affaldsgebyrerne for den enkelte ejendom afhænger af hvor meget affald, der produceres (vedtaget i Borgerrepræsentationen 3. oktober 2013). I et andet projekt under flagskibet lægges der særlig vægt på børn og unge, og i samarbejde med Børne- og Ungdomsforvaltningen er der igangsat en række initiativer, der retter sig mod denne målgruppe – bl.a. den affaldsfri skole.

Tema 3. Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling

- Bioaffald og tung transport på biogas. Der er etableret en gastankstation på Prags Boulevard og der er iværksat et forsøg med fire skraldebiler, der kører på gas i stedet for diesel. Der er også gennemført undersøgelser af biogasteknologier for organisk affald, både de tekniske muligheder samt miljømæssige og økonomiske konsekvenser. Teknik- og Miljøudvalget har på flere møder drøftet mulighederne for at iværksætte kildesortering og bioforgasning af det organiske affald fra kommunens villaer. På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 17. marts 2014 blev det besluttet, at dagrenovationsordningen for villaer udvides fra 1. september 2015, så den omfatter indsamling af kildesorteret organisk affald som et frivilligt tilbud. Det blev ligeledes besluttet, at der igangsættes forsøg med ikke-kildesorteret dagrenovation ved brug af RENescience teknologi svarende til RENescienceanlæggets kapacitet.

Tema 4. Bedre affaldsbehandling

- Initiativ nr. 39: Undersøgelse af nye genanvendelsesmuligheder. 5.000 etageboliger på Østerbro deltager i et forsøg med indsamling af pizzabakker og mælkekartoner i papbeholderen. Formålet er at undersøge, om der er mulighed for at genanvende dette affald –

også den tynde plastfolie inde i mælkekartonerne. Projektet er blevet meget positivt modtaget af borgerne i området. Affaldsmængderne er steget med ca. 20 % både på grund af pizzabakkerne og mælkekartoner, men også på grund af en øget udsortering i husstandene af andet pap og karton.

Mange af initiativerne i Ressource og Affaldsplan 2018 er således godt på vej, men nogle af initiativerne er blevet forsinket.

Følgende initiativer, som har betydning for affaldsmængderne og genanvendelsen, er ikke (helt eller delvist) sat i gang som planlagt i 2013:

- Initiativ nr. 1. og 2. Storskrald til genbrug via nærgenbrugsstationerne er blevet forsinket, da de logistiske forhold har været vanskeligere end forventet. Samtidig er etableringen af den første ud af tre nye nærgenbrugsstationer blevet udskudt, da projektet ikke har opnået den fornødne anlægsbevilling i forbindelse med budget 2014. Der er tale om et projekt på Hermann Bangs Plads, hvor der samarbejdes om at udvikle et nyt byrum, der forener en nærgenbrugsstation, herunder bytte- og genbrugsfaciliteter, med rekreative byrumsfunktioner.
- Initiativ nr. 11: Optimering af affaldsordninger. Med initiativet skal affaldsordningerne på de enkelte ejendomme gennemgås for at sikre, at alle borgere har let adgang til at udsortere glas, metal, plast, pap, papir mv. til genanvendelse. Dele af initiativet er sat i gang (bl.a. i forbindelse med Genbrug er Guld kampagnen), mens andre dele er blevet forsinket, da opgaverne skulle præciseres yderligere.
- Initiativ nr. 29: Fraktionsopdelt storskrald. Med initiativet skal træ, der egner sig til genanvendelse, udsorteres fra storskraldet. Projektet er blevet forsinket på grund af uklarhed med hensyn til, hvornår affaldstræ er rent nok til at det egner sig til genanvendelse – ét af spørgsmålene har fx været, om det må indeholde maling. Dette er nu blevet undersøgt og afklaret, og projektet kan sættes i gang, så snart indsamlingsordningen for storskrald udbydes næste gang. Den ændrede måde at indsamle storskrald på vil således først kunne træde i kraft og få effekt fra september 2015.

Sammenfatning

Alt i alt er der god fremdrift i Ressource- og affaldsplan 2018. Med den nuværende udvikling og med de tiltag, der sættes i værk i 2014, er det forvaltningens vurdering at 2018-målene kan nås trods de nævnte forsinkelser.

I forhold til implementeringen af regeringens ressourcestrategi er Københavns Kommune blandt de førende. Mange af landets øvrige kommuner er først nu ved at udarbejde deres nye affaldsplaner.

Midler forbrugt i 2013

Som følge af udskydelsen af nogle af initiativerne er ikke alle de afsatte midler for 2013 blevet brugt. Da de planlagte initiativer fortsat skal gennemføres, vil de uforbrugte midler på 8,5 mio. kr. blive overført til resten af planperioden.

Udgifterne er indeholdt i den økonomiske genopretningsplan for økonomi og takster, som senest blev afleveret i forbindelse med regnskabet for 2013. De årlige takstfastsættelser fremlægges årligt til udvalgets godkendelse.

Videre proces

Næste årlige status for arbejdet med Ressource- og Affaldsplan 2018 vil blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget i løbet af 2015 i forbindelse med at der foretages en midtvejsevaluering af planen. I den forbindelse vil planens mål og initiativer kunne blive revideret.

Simon Kjær Hansen,
Serviceområdechef, Byens Udvikling

Bilag 1: RESSOURCE- OG AFFALDSPLAN 2018 – Status og justeringer på de enkelte initiativer, 2013

Kritisk	Justeringer af tidsplan
Kræver fokus	○ Sættes i gang i 2014
Kører fint	

Indsatser	Initiativer	År	Status og justeringer	TMU 2014
Mere skal bruges igen	1. Storskrald til nærgenbrugsstationernes byttefaciliteter	2013-2017	Påbegyndes først i 2014.	
	2. Tre nye nærgenbrugsstationer	2013-2017	Herman Bangs Plads forventes at blive den første af de tre nærgenbrugsstationer. Projektet er forsinket og forventes først at stå klar i 2015.	X
	3. Genbrug af mursten a) Mursten på genbrugsstationer b) Demoprojekt	2014-2015 2014-2015	a) Er påbegyndt allerede i 2013. Der er indsamlet 3.689 ton mursten til direkte genbrug i 2013, hvoraf de 143 ton stammer fra genbrugsstationerne og resten fra nedrivningsprojekter. b) Skal først sættes i gang i 2014.	
Madspildet skal reduceres	4. Samarbejde med detailhandelen om begrænsning af madspild	2014-2018	Der er indgået en dialog med detailhandlen omkring madspild, hvor der sættes særlig fokus på udsmidning af mad i original emballage.	
	5. Kampagne for reduktion af madspild fra husholdninger	2013-2017	Der er afviklet et kollegieprojekt og et skoleprojekt. Der var ikke afsat midler til 2013, så der er brugt 51.000 ud af de 140.000 der er afsat til 2014.	
Indkøb skal være ressourcebevidste	6. Pantordning på emballage, bl.a. genbrugsbægre	2014-2016	Skal først sættes i gang i 2014.	
	7. Københavns Kommune stiller krav i egne indkøb	2013	Ikke påbegyndt. Det er en udfordring, at få affaldsforebyggelse til at indgå som en del af kommunens indkøbsaftaler. Initiativet overføres til 2014.	
Bedre sorteringsmuligheder i etageboliger	8. Beholdere til plast, metal og småt elektronik	2013	Udrulningen af beholdere er foregået planmæssigt. I kølvandet på de nye beholdere har sorteringskampagnen "Genbrug er Guld" været lanceret. Kampagnen vandt i 2013 den internationale ISWA Communication Award foran 48 deltagere fra 27 lande.	
	9. Øget indsamling af farligt affald	2013-2017	Udvidelse af batteriordningen er påbegyndt, men der er endnu ikke fundet en alternativ ordning til viceværtordningen – hvorfor Miljøbilen ikke er blevet nedlagt.	X
	10. Bedre mærkning og skiltning	2013-2018	Kommunen har givet de forskellige affaldstyper hver deres farve. Farverne bliver brugt i informationsmaterialer og på lågene af de nye affaldsbeholdere til metal, hård plast og elektronik. Udsiftningen af låg på de eksisterende affaldsbeholdere er påbegyndt. 19 kommuner under Vestforbrænding har vedtaget at bruge samme farvekoder og kommunen har opfordret Miljøstyrelsen til at støtte op om farverne, så de på sigt kan blive nationale.	
	11. Gennemgang og optimering af affaldsordninger	2013-2015	Der har i 2013 været fokus på optimering af genanvendelsesordningerne i forbindelse med udrulningen af nye ordninger, gennemgang af aftaler om storskraldsordninger, puljesammenlægninger samt i forbindelse med omlægninger efter henvendelse fra borgerne. Dele af initiativet er forsinket, da opgaverne ikke har været defineret klart nok ved årets begyndelse.	
	12. Mere genanvendelse gennem forsøg hos borgerne	2013-2015	Der var få ansøgere til puljen i 2013, så der er brugt færre midler end forventet. Midlerne overføres til 2016, hvor initiativet fortsætter. Fremover gøres der en ekstra indsats for at informere om initiativet/puljen.	
Villaer skal have flere sorteringsmuligheder	13. Indsamling af plast og metal	2015	Alle tre initiativer blev forelagt og godkendt af TMU den 21. oktober 2013. Som en konsekvens af at indsamlingsudbuddene er blevet udskudt med et halvt år, rykkes datoen for implementering fra 1. marts 2015 til 1. september 2015.	
	14. Øget service ved afhentning af affald	2014-2015		
	15. Frivillig beholder til pap	2015-2018		
Innovative affaldsløsninger skal tænkes ind i byens rum	16. Flere muligheder for sortering i Indre By	2014-2016	På Nørrebro har der været kørt et forsøg med en såkaldt "SMART" miljøstation – dvs. nedgravede containere ude på gaden. Erfaringerne herfra kan bane vejen for at lave nogle mindre sorteringspladser i Indre By.	
	17. Flerfunktionelle affaldsløsninger i det offentlige rum	2013-2017	Der arbejdes på, at nærgenbrugsstationen på Herman Bangs Plads bliver flerfunktionel.	(X)
	18. Retningslinjer for affaldsløsninger giver fælles overblik	2015	Skal først sættes i gang i 2015.	
Erhvervsdrivende skal sortere mere	19. Information til nystartede virksomheder	2013	Initiativet er udsat til 2014, da det er vurderet, at der er synergi ved at se det i sammenhæng med nr. 20 og 21, som påbegyndes i 2014. Indledende samarbejde med KES er så småt påbegyndt.	
	20. Samarbejde med brancheorganisationer	2014	Skal ses i sammenhæng med nr. 19 og 21.	
	21. Intensiveret tilsynsindsats og håndhævelse	2014-2016	Der skulle have været ansat fem tilsynsmedarbejdere i løbet af 2013 for perioden 2014-2016. Ansættelserne er blevet forsinket.	

	22. Tilpasning af genbrugsstationerne	Løbende	Ikke påbegyndt, men der bliver taget hul på en strategi for genbrugsstationer i 2014.	
	23. Bedre sortering i de kommunale institutioner	2014	Der er etableret et samarbejde med Kommunens Miljøledelsesforum (bestående af miljøledelseskoordinatorer fra alle forvaltningerne). De har valgt "Affald" som årets tema. Det er igangsat, at der skal søges om penge til indsamlingsmateriel i de kommunale institutioner.	
Mere rent bygge- og anlægsaffald	24. Miljøkortlægning af kommunale bygninger og PCB-strategi	2013-2015	Initiativet skal finansieres af Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme (2½ mio. kr.). Men det er blevet taget af budgettet i både 2013 og 2014.	
	25. Skærpede krav til kommunale byggeprojekter	2013-2015	Projektet er ikke påbegyndt endnu og midlerne i 2013 er ikke blevet brugt, men overføres til 2014 og 2015.	
	26. Styr på affaldsstrømmene	2013-2015	Der er udarbejdet faktaark om klassificering af affald og kommunen er blevet en del af et kommunalt netværk. Teknologisk Institut har udviklet en "pistol" som kan fortælle, hvilke stoffer et givent materiale indeholder. Det undersøges i øjeblikket om dette redskab kan bruges i forbindelse med initiativ nr. 24, 25 og 26.	
Affaldsindsamlingen skal være støjfri og CO2 neutral	27. Forsøg med skraldebiler på alternative brændsler	2013-2018	I 2013 åbnede den første gastankstation i København. Det er den første i en række som energiselskabet E.ON og OK planlægger at åbne i samarbejde med bl.a. KK. Kommunen har købt fire gasdrevne skraldebiler.	
	28. Udviklingsprojekt "Smartere og støjfri affaldsindsamling"	2013-2018	Ikke påbegyndt, men vil blive sat i gang i 2014.	
Affaldsindsamlingen skal forbedre genanvendelsen	29. Fraktionsopdelt indsamling af storskrald	2013-2015	Er påbegyndt, men forsinket bl.a. fordi der er opstået tvivl om, hvad der kan defineres som "rent træ". Dette undersøges i øjeblikket, hvorefter det skrives ind i de kommende storskraldsudbud. Initiativet indgik i forslag til revideret regulativ for husholdningsaffald (TMU 9/9 - 2013).	
	30. Færre containere til storskrald	2013-2015	Udfasningen af containere er sat i gang.	
	31. Separat indsamlingsordning for juletræer	2013	Initiativet har været forsinket og det kører i hele planperioden. Initiativet indgik i forslag til revideret regulativ for husholdningsaffald (TMU 9/9 - 2013). Der er samlet mindre ind end forventet og der er lavet et udkast til evaluering af ordningen.	
Nyt affaldsbehandlingscenter på Amager	32. Øget modtagekontrol og strafgebyr på forbrændingsanlæg	2015-2017	Skal først sættes i gang i 2015.	
	33. Sorteringsanlæg på affaldsbehandlingscenteret	2013-2018	Der er udpeget en projektleder hos ARC og der er fremdrift i projektet.	
Bedre styr på elektronikaffaldet	34. Kortlægning af elektronikaffaldsstrømme og efterfølgende behandling/eksport	2013-2014	Der er lavet en samlet idébeskrivelse for initiativerne 34, 35 og 36. Kommunen har deltaget i workshops, der har ført til Miljøstyrelsens rapport "Hvor bliver elektronikaffaldet af?". Tilsyns- og informationsindsatsen er ikke påbegyndt endnu, men opgaven med at kortlægge kommunens eget elektronikaffald er igangsat. Kommunen er i dialog med producentansvarsordningen for elektronikaffald (DPA-System). De afsatte midler for 2013 er ikke anvendt og overføres til 2014 og 2015.	
	35. Større tilsyns- og informationsindsats	2013-2018		
	36. Københavns Kommunes eget elektronikaffald	2017-2018		
Mere afsætning af affald og udvikling af behandlingsmuligheder	37. Skærpede krav i udbud af indsamlet kommunalt affald	2013-2018	De afsatte midler for 2013 er ikke anvendt og fordeles ud på årene 2015-2018.	X
	38. Påvirkning af de private sorterings- og behandlingsanlæg	2013-2018	De afsatte midler for 2013 er ikke anvendt og fordeles ud på årene 2015-2018.	
	39. Undersøgelse af nye genanvendelsesmuligheder	2013-2018	På Østerbro kører et forsøg, hvor beboerne i 5.000 lejligheder kan aflevere deres drikkevarekartoner og pizzabakker i papbeholderen. Forsøget skal vise, hvor meget der egner sig til genanvendelse og om det kan betale sig miljømæssigt og økonomisk.	
Flagskib: Sydhavn Genbrugscenter	Etablering af genbrugscenter	2015	Opgaven er sat i gang, men er blevet forsinket på grund af uklarheder om miljøgodkendelsen og finansieringen af genbrugsaktiviteterne.	
Flagskib: Københavnernes Sorterer!	a) Holdningsbearbejdning - kildesortering skal være en social norm	2013-2018	Opgaven påbegyndes først i 2014. Midlerne for 2013 fordeles ud på årene 2015-2018.	
	b) Opbygning og vedligeholdelse af et vicevært-netværk	2013	Kører fint og fortsætter i resten af planperioden.	
	c) Klare sammenhænge i Affaldssystemet	2014	Er påbegyndt allerede i 2013. I forbindelse med revidering af affaldsregulativet (TMU 9/9 2013) blev gebyrstrukturen ændret således, at den bl.a. fastsættes i forhold til den tilmeldte beholdervolumen på ejendommen. Dette giver et økonomisk incitament til at sortere affaldet og reducere mængden af dagrenovation.	
	d) Analyser af restaffald	2016	Skal først sættes i gang i 2016.	
	e) Daginstitutioner: Skraldehelt	2013-2018	Kører som ét samlet projekt. Der er indgået en skriftlig aftale med BUF, som er tovholder på projektet. Den affaldsfri skole er blevet sat i gang før tid, da Husum Skole var meget interesseret i at gå i gang med det samme.	
	f) Skoler: Ressourceforvalteruddannelsen			
	g) Daginstitutioner og skoler: Børnenes affalds- og ressourcemesse			
	h) Eksterne læringsrum - inspiration i naturen			
	i) Den affaldsfri skole	2016-2017		
	j) Skraldemændene fortæller om affaldshåndtering	2013-2018		

Flagskib: Bioaffald og tung transport på biogas	a) Afklaring af beslutningsgrundlag, vedr. valg af REnescience og et traditionelt biogasanlæg	2013-2014	Der er gennemført undersøgelser af biogasteknologier for organisk affald, både de tekniske muligheder og miljømæssige og økonomiske konsekvenser. På TMU mødet den 17. marts 2014 blev det besluttet, at dagrenovationsordningen for villaer udvides fra 1. september 2015, så den omfatter indsamling af kildesorteret organisk affald som et frivilligt tilbud. Det blev ligeledes besluttet, at der igangsættes forsøg med ikke kildesorteret dagrenovation ved brug af REnescience teknologi svarende til REnescienceanlæggets kapacitet. Det kan få indflydelse på vores opnåelse af genanvendelsesmålet, hvis REnescience ikke "tæller" som genanvendelse.	X
	b) Løsning 1: Etablering af traditionelt biogasanlæg	2014-2017		
	c) Løsning 1: Indsamling af madaffald separat fra villaer	2015-2016		
	d) Løsning 1: Indsamling af madaffald separat fra etageboliger	2016-2017		
	e) Løsning 2: Etablering af REnescience anlæg	2014-2017		
	f) Indsats for erhverv	2013-2018		
	g) Skraldebiler på biogas	2014-2018	Se initiativ nr. 27.	X
Flagskib: Forebyggelse og genanvendelse af plast	a) Road map	2014	Initiativerne kører som ét samlet projekt. Projektet afsluttes til august 2014, hvor der vil blive lavet en selvstændig afrapportering. Man kan følge projektet på: www.plastic-zero.com . Med hensyn til punkt f, forventes der at foreligge en manual i foråret 2014.	
	b) Forebyggelse af plastaffald	2013-2018		
	c) Indsamling og genanvendelse af plastaffald	2013-2018		
	d) Anvendelse af sekundær plast	2013-2018		
	e) Rådgivning af virksomheder om bedre udsortering af plastaffald	2013-2018		
	f) Manual for at inkludere affaldsforebyggelse i grønne offentlige indkøb	2013-2018		
